



ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ
ХРАМОВ СЕВЕРА

www.obsheedelo.ru



ЭКСПЕДИЦИИ

2025



ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ СЕВЕРА» объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить древние святыни Православия и памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тверской, Костромской областях, республиках Коми и Карелия.

До сих пор на Русском Севере можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В годы советской власти огромное число храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады, оставалось в запустении. Нам выпала честь найти эти храмы, сохранить и передать потомкам. В первую очередь важно провести противоаварийные работы: отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. Если не сделать этого сейчас, многие деревянные святыни скоро разрушатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов.

Начало проекта было положено 75-летним Дедушкой Александром Порфирьевичем Слепниным в поморской деревне Ворзогоры. На свои средства он стал перекрывать крышу колокольни. Узнав о добром начинании, ему стали помогать прихожане московских храмов. В наши дни Проект осуществляется по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За девятнадцать лет существования проекта было проведено 690 экспедиций, в ходе которых обследовано более 360 храмов и часовен; в 205 из них проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы.

В 2025 году состоялось 72 экспедиции, в которых приняло участие 970 добровольцев из разных регионов России. Работы проводились в 42 храмах и часовнях на Русском Севере. В 5 храмах, впервые с момента их закрытия, были отслужены Божественные литургии.

ЧАСОВНЯ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 1860 г. Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, д. Вороний Остров



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- территория подготовлена к работам: покослена трава, проведена обработка от клещей;
- разгружены и складированы пиломатериалы;
- укреплена сгнившая основная несущая балка над «небесами»;
- для крыльца изготовлено новое основание из бруса с врубкой ласточкин хвост;
- доски для кровли отстроганы, продорожены, обработаны антисептиком;
- проведены работы по установке консервационных кровель на основном объеме и крыльце: демонтированы сгнившие тесины, фрагментарно укреплен («вычинен») верхний венец, уложены: нижний ряд доски, профнастил и верхний ряд дорожной доски;
- расчищен и покрашен металл на главе и кресте на основном объеме.



ЧАСОВНЯ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

XVIII в. Республика Карелия, Пудожский р-н, ур. Гольяницы



В 2025 г. завершена реставрация часовни Спаса Преображения на о. Гольяница.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
(помощь профессиональным плотникам-реставраторам):

- возведены леса на звоннице;
- установлена главка над звонницей: собран каркас, на главу уложена береста, вырублен и установлен городчатый лемех из осины;
- покрашены тес и лемех;
- установлена система молниезащиты;
- демонтированы строительные леса.



Иереем Олегом Червяковым были освящены главки и отслужены две Божественные литургии с участием местных жителей и их гостей.



ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО

1762 г. Костромская область, Нейский р-н, с. Кужбал



В 2025 г. при активной поддержке местных жителей завершены консервационные работы на Храме Воскресения Слоущего.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
В 2025 г. завершены консервационные работы на Храме Воскресения Слоущего.

- на основном объеме установлена последняя пара стропил, демонтирована временная и установлена постоянная обрешетки, уложены листы ондулина;
- на апсиде установлена консервационная кровля: на предварительно расчищенную историческую кровлю параллельно скатам установлена доска для крепления обрешетки, смонтирована обрешетка, уложены листы ондулина;
- в кровле над основным объемом устроен технический люк;
- выполнена зашивка фронтона и отдельных участков между алтарем и основным объемом;
- на крыльце установлены две дополнительные ступени;
- расчищен цоколь;
- пиломатериалы обработаны антисептиком;
- убрана территория.




ЧАСОВНЯ ПРОРОКА ИЛИИ

Конец XIX в. Костромская область, Антроповский р-н, д. Курново



Работы проводились при поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
– вырублена поросль вокруг часовни;
– выкопаны водоотводящие канавки;
– часовня расчищена от хлама;
– отремонтирована дверь, оконный проем зашит доской;
– демонтированы остатки сгнившей металлической кровли;
– проведен частичный ремонт стропильной системы;
– установлен крест;
– смонтирована обрешетка;
– кровля временно закрыта строительными тентами.

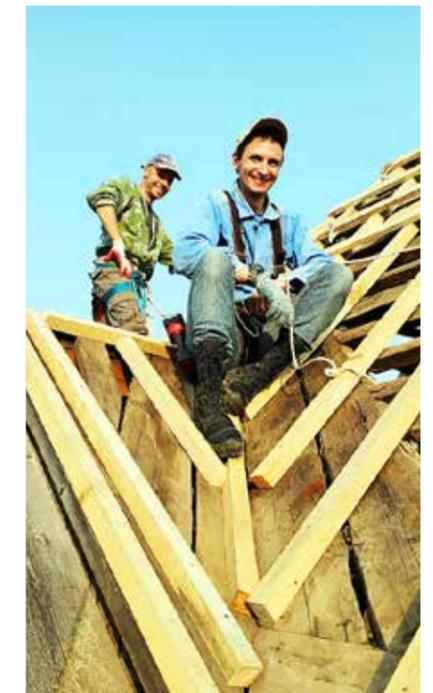

ЭКСПЕДИЦИИ
ВИННИЦЫ-1, 2, 3, 4
РАЗВЕДКА,
ТРУДОВЫЕ

24.01.2025 – 26.01.2025
30.04.2025 – 03.05.2025
31.05.2025 – 08.06.2025
06.06.2025 – 15.06.2025

Командиры: Бакшанский
Владислав Дмитриевич,
Серебряков Роман
Александрович

ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1871 г. Ленинградская область, Подпорожский р-н, с. Винницы



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проведены обмеры, фотофиксация и обследование храма;
- разобраны завалы во всем объеме храма (вывезли 4 тракторные телеги);
- провалившаяся солея выровнена, под нее подведены опоры;
- установлены независимые подпольные конструкции, настелен пол;
- крыльцо поднято и выровнено, два нижних венца заменены на брус;
- в оконные проемы вставлены щиты из поликарбоната;
- начаты работы по кровле;
- храм подготовлен к богослужениям.

14 июня иереем Александром Нефедовым отслужена первая за десятки лет Божественная литургия.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 1901 г. Республика Коми, Усть-Вымский р-н, д. Вездино



Работы проводились при активной поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проведены обмеры, фотофиксация и обследование храма;
- интерьер церкви расчищен от векового мусора и завалов;
- выровнен и укреплен фундамент;
- в трапезной установлены временные (до следующего года) противоаварийные конструкции, кровля закрыта гидроизоляционным материалом;
- кровли основного объема и звонницы расчищены и покрашены краской по металлу 3 в 1;
- местным мастером изготовлены два креста по образцу сохранившегося, все три креста установлены на храме;
- на ярусе звона укреплен выход на ярус и навешено дверное полотно, смонтировано покрытие из сплошного настила с двумя слоями стеклоизола;
- установлен иконостас: собран каркас, вставлены привезенные копии икон;
- выполнен водоотвод от стен храма.



СВВ. ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ, 1850 г. И МАГАЗЕЯ (АМБАР), XVIII в.

Архангельская область, Онежский р-н, д. Ворзогоры



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

ПО ХРАМУ СВВ. ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ:

- скошена трава и прорежен лес в радиусе 15 м, вырублена поросль между дорогой и храмом;
- удалены надписи со стен;
- в одном из оконных проемов на место разбитого вставлено стекло.

ПО МАГАЗЕЕ:

- выполнены подготовительные работы: установлен верстак, доски продорожены и обработаны антисептиком;
- на половине северного ската уложена дорожная доска;
- вычищены и выметены все помещения магазина.



КОМПЛЕКС ВОРЗОГОРСКОГО ПРИХОДА, XVII-XIXВВ., МАГАЗЕЯ (АМБАР), XVIII в.

Архангельская область, Онежский р-н, д. Ворзогоры




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Произведены обмеры колокольни с фиксацией кренов, Никольского храма, Введенского храма, где зафиксированы в т.ч. прогибы потолочных балок.

ХРАМ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:
– в интерьере снята обшивка XXв. (вагонка и гипсокартон), удалены из стен мелкие гвозди;
– изготовлены и установлены отливы на месте утраченных.

ЦЕРКОВЬ ПРП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ:
– продолжена расчистка подлеса;
– обновлены водоотводные канавы вокруг храма.

МАГАЗЕЯ:
– доски продорожены и обработаны антисептиком;
– продолжена укладка дорожной доски.

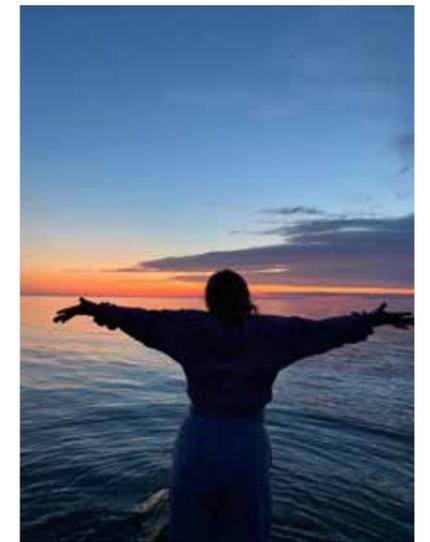

ЧАСОВНЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Вторая половина XIX в. Республика Коми, Княжпогостский район,
д. Кони



до



после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- обкошена территория храма;
- промаркированы и сложены на специально подготовленной площадке детали рухнувшего купола молельной части часовни (восьмигранный сруб купола, сохранившиеся фрагменты потолка, барабан главки);
- разобрана большая часть завалов.



ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА


1858 г. Архангельская область, Приморский р-н, д. Куя



Работы проводились при активной поддержке местных жителей.


ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- на барже доставлены материалы;
- разобраны завалы обрушившихся колокольни и притвора;
- установлен навес для сохранившихся фрагментов колокольни и притвора;
- в интерьере храма убраны поздние наслоения грунта;
- настелены полы;
- установлена консервационная кровля над большей частью храма;
- установлен крест;
- расчищена территория и покошена трава.

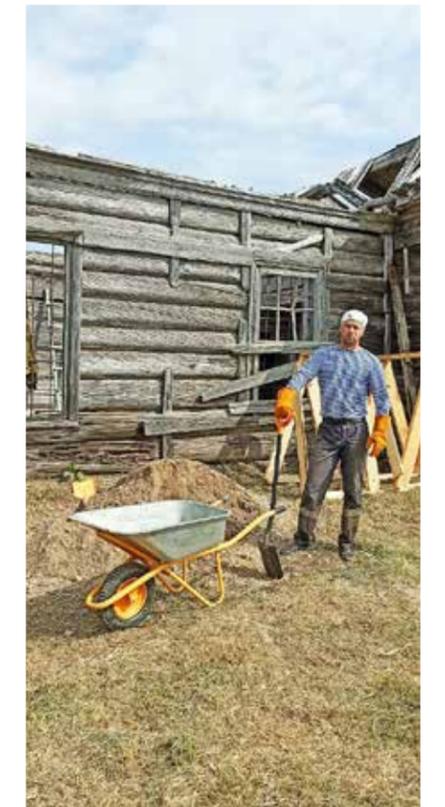

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

XVII-XVIII вв. г. Кострома, «Музей деревянного зодчества»,
ул. Просвещения 1Б

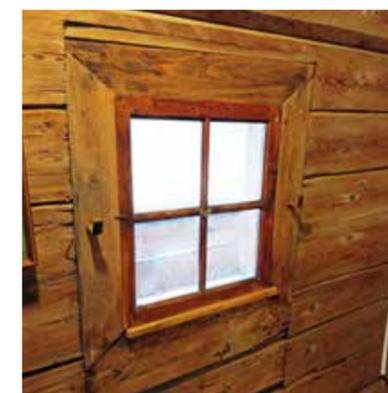

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
– проведены обследование
и фотофиксация часовни.

ЧАСОВНЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Кон. XVII – нач. XVIII вв. Республика Карелия, Беломорский р-н,
д. Пулозеро



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- территория вокруг часовни расчищена от травы, кустарников, поваленных деревьев;
- откопаны нижние венцы, устроены продухи и водоотводящие канавки;
- разобраны завалы в интерьере часовни, убран мусор и остатки гнилой древесины;
- детали конструкций расчищены от гнили и мха, отдельные элементы сложены на помосте рядом с часовней;
- укреплен фронтон;
- проведены обмеры и фотофиксация;
- около Церкви Параскевы Пятницы в деревне Онежены установлен информационный щит.



ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 1915 г. Архангельская область, Приморский р-н, д. Козлы




Работы проводились при поддержке местных жителей.


ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- установлен новый фундамент из шестидесяти шести столбов;
- выровнена геометрия срубов храма;
- расчищено подпольное пространство;
- настелены новые полы в четверике, алтаре и трапезной, укреплены и частично заменены подпольные конструкции;
- установлен иконостас с использованием деталей иконостаса начала XXв.;
- проведена генеральная уборка.

23 августа 2025 года впервые за 100 лет была совершена Божественная литургия, которую отслужили благочинный Приморского округа Архангельской области протоиерей Владимир Новиков и руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев.






ЧАСОВНЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ XIX в. Архангельская область, Плесецкий р-н, ур. Яблонь-Горка

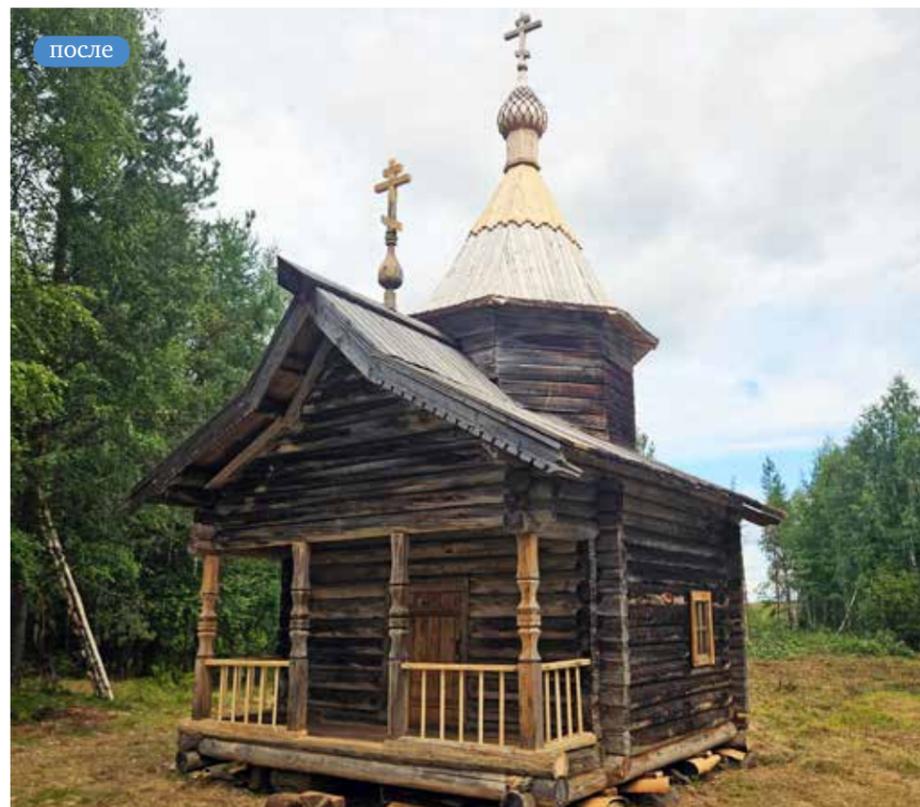

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- под южную стену установлен новый фундамент из валунов;
- выровнен крен часовни в южную сторону;
- на шатре проложена береста между слоями теса на южном и северо-восточном скатах кровли, покрыты тесом с берестой три недостающие грани, в верхней части уложен третий декоративный слой теса;
- на крыльце добавлен один венец, уложены пол и потолок, установлены две оригинальные колонны и две новодельные, смонтировано ограждение (перила и балясины);
- отремонтирован крест на малой главе;
- все памятные таблички перенесены на стенд.

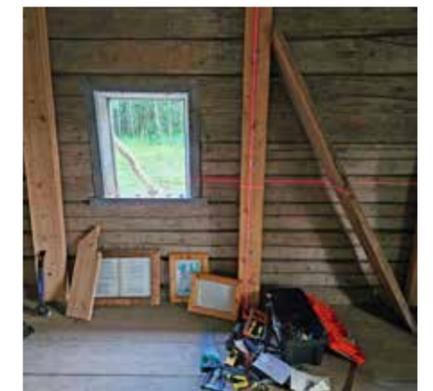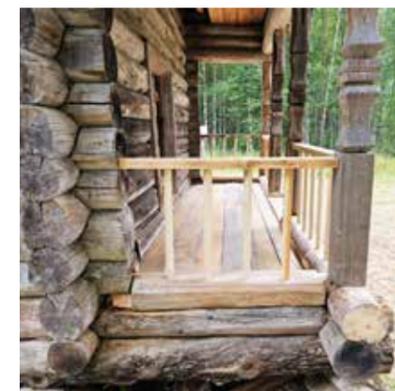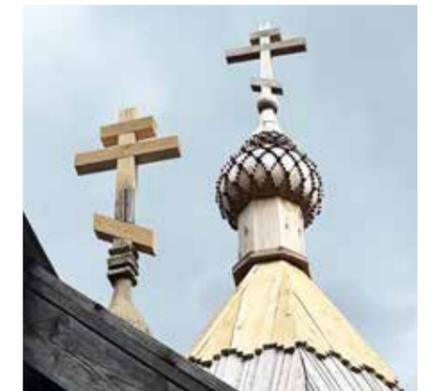

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 1862 г. Вологодская область, Вытегорский р-н, д. Шимозеро



Работы проводились при активной поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- сильно поврежденные участки кровли закрыты оцинкованными листами металла и профнастилом;
- проведен ремонт сохранившегося металла на кровле: устранены протечки, металл покрашен антикоррозийной краской;
- на кровле апсиды на месте утраченной главки установлена заглушка из оцинкованного листа металла;
- фрагмент западного фронтона зашит доской;
- оконные проемы закрыты поликарбонатом;
- новые деревянные элементы конструкций обработаны антисептиком;
- в интерьере проведена сухая и влажная уборки;
- элементы подлинных конструкций, декора и остатки материала аккуратно сложены в интерьере.



ЧАСОВНЯ СВВ. МЧЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ

Середина XIX в. Вологодская область, Вытегорский р-н, д. Шимозеро




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- пиломатериалы и крест на звонницу доставлены по воде;
- проведено протезирование двух верхних венцов на северном фасаде;
- укреплена балка фронтона, доски на кровлю отстроганы и продорожены;
- на кровле полностью уложен тес, заменен вспучившийся тес, на восточном фасаде подшит свес и установлены причелины; на северном фасаде выровнены и зафиксированы края свеса;
- зашпаклеваны и окрашены крест и главка на часовне;
- проведены работы на звоннице: собран каркас, установлен колокол, покрыты полицы, установлены элементы ограждения звонницы (балясины) с добавлением новых и сохранением старых деталей;
- пленка в оконных проемах заменена на поликарбонат;
- изготовлено крыльцо;
- обрезаны ветки с ближайших деревьев;
- в интерьере отремонтированы пол и потолок.



КОЛОКОЛЬНЯ ХРАМА СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 1884 г. Республика Коми, Ижемский р-н, с. Мошьюга

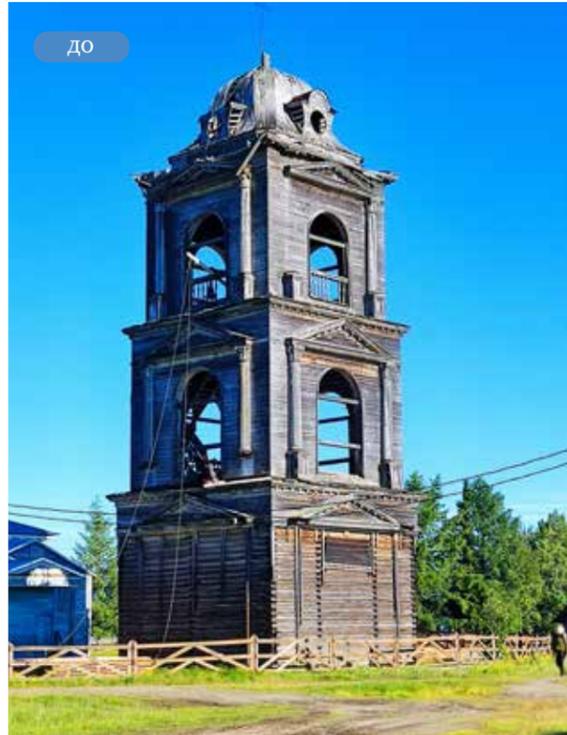

Работы проводились при активной поддержке местных жителей.



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- установлены балясины на втором ярусе;
- проведен ремонт полов второго яруса;
- установлен молниеотвод с длиной токоотвода более 40 метров;
- неиспользованный материал сложен на первом ярусе колокольни.



ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА

1725 г. Ярославская область, Ростовский р-н, с. Богослов

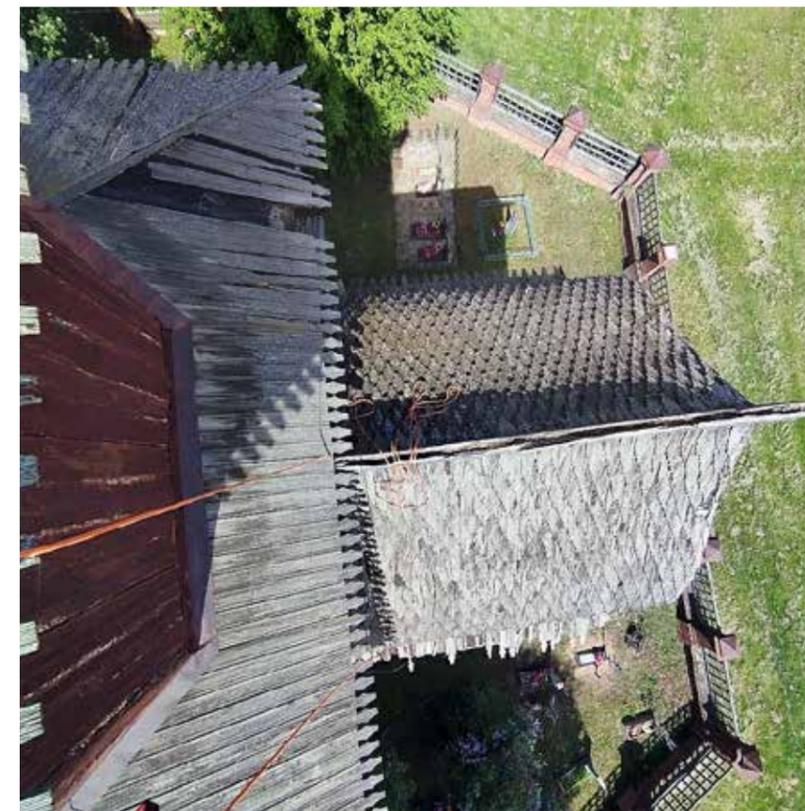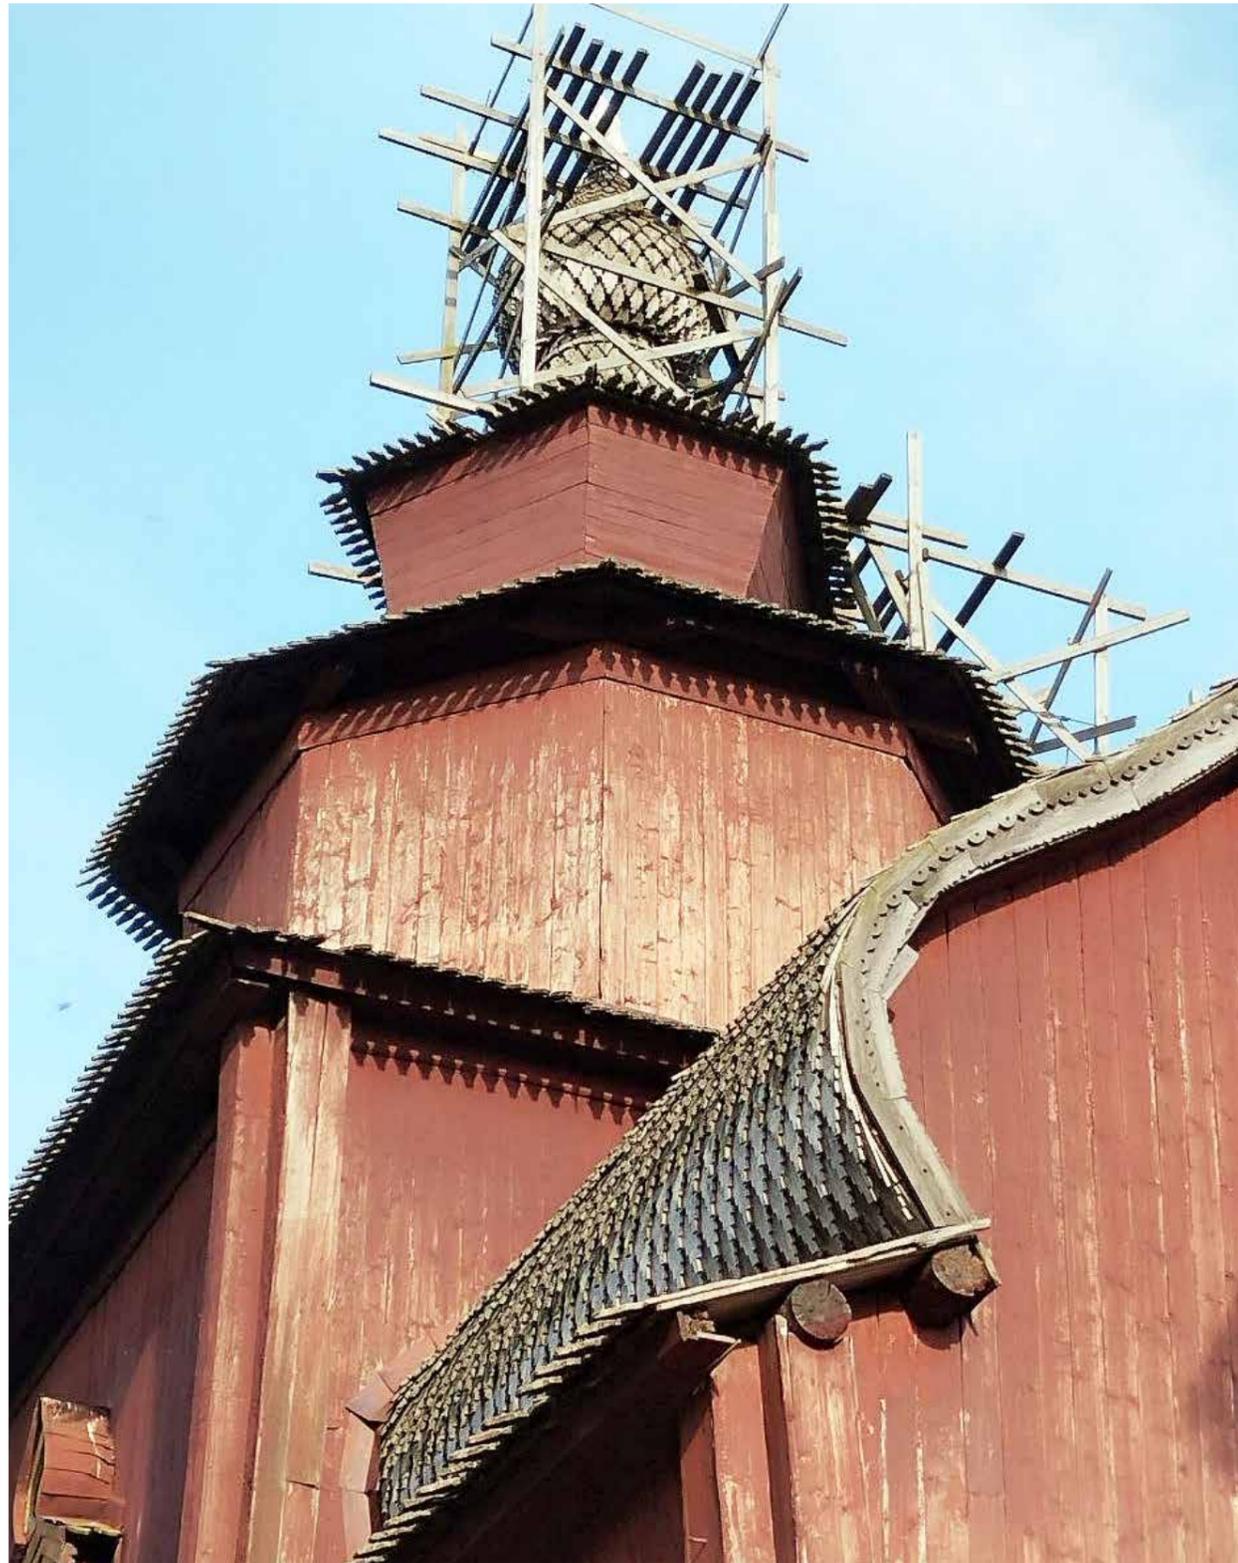

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проведен ремонт кровли на южном скате четверика колокольни: демонтирован ветхий верхний ряд теса, уложен гидроизоляционный материал, поверх которого установлена дорожная доска;
- на южной стороне алтарной бочки проведены следующие работы: установлены леса до уровня полиц, на полицях установлена временная кровля; на бочке устранена протечка;
- устранена локальная протечка в северо-восточном углу основного объема;
- детьми проведена уборка в храме.




ХРАМ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ПРОКОПИЯ УСТЮЖСКОГО 1917 г. Республика Коми, Койгородский р-н, пос. Нючпас



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- на основном четверике установлены восемь сжимов из бруса и заменены сгнившие бревна на северной стене;
- зашиты утраченные части стен северного и южного фасадов апсиды и на нижнем четверике колокольни;
- уложены недостающие доски по периметру основного четверика и на солее, установлен амвон;
- укреплен пол трапезной: существующий пол временно снят, установлены четыре дополнительные лаги, доски снова уложены;
- установлен на место косяк арочного проема в восточной стене трапезной;
- смонтированы лавки вдоль стен основного четверика и трапезной;
- изготовлен и установлен над основным объемом деревянный крест;
- начата установка металлической сетки от птиц на вентиляционные окна и на зазор под кровлей;
- продублирован пол на первом и втором ярусах колокольни;
- установлена лестница на второй ярус колокольни;
- на ярусе звона установлен деревянный настил и заменен сгнивший парапет, установлены пятьдесят балясин;
- смонтирована консервационная кровля с использованием стеклоизола на шатре колокольни и ондулина на полицах;
- заменены стропила и обрешетка над люкарнами на северном и южном фасадах колокольни;
- проведен ремонт металлического покрытия главки и отлива под барабаном;
- заменены сгнившие детали барабана;
- дополнительно укреплены щиты из поликарбоната в оконных проемах;

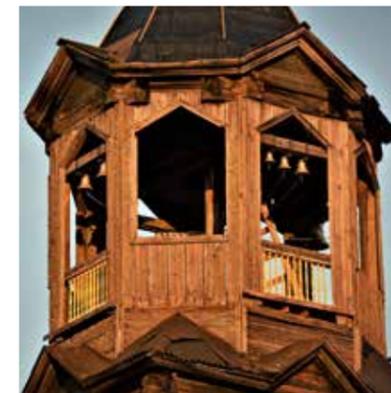

- небольшие щели и трещины по всему храму законопачены специально подготовленным мхом;
- повешены 7 колоколов, освященные 17 августа 2025г.;
- изготовлены и установлены фасадные таблички на храм и на дом архитектора, руководившего строительством храма;
- проведены работы по благоустройству прихрамовой территории и перед домом архитектора;
- закуплены и доставлены комплектующие для молниезащиты.

Экспедиция состояла в основном из местных жителей.



ЧАСОВНЯ СВЯТОГО САМСОНА

XIX в. Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, д. Кондобережская

до



после



Работы проводились при активной поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- смонтированы консервационные кровли над основным объемом и притвором: на предварительно расчищенный существующий тес установлена разреженная обрешетка, уложен профнастил и дорожная доска, стык скатов закрыт досками, а примыкание скатов к восьмерику звонницы - стеклоизолом;
- установлено консервационное покрытие на ярусе звона: площадка поднята до уровня полиц с уклоном от центра площадки, на площадку и полицы уложены два слоя стеклоизола, смонтирован настил из дорожной доски, переделан люк;
- укреплены столбы звонницы;
- конструкции под уровнем звона, имеющие биопоражения, расчищены и обработаны антисептиком;
- напечатаны, привезены и установлены изображения икон, предоставленные Музеем Изобразительных искусств Карелии;
- установлен колокол на ярусе звона;
- сотрудником музея-заповедника Кижского Софией Беляевой проведены работы по закреплению красочного слоя деревянного креста из соседней деревни Вигово, хранящегося в часовне.



ХРАМ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛ ПЕТРА И ПАВЛА 1695 г. Республика Карелия, Беломорский р-н, с. Вирма



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- разгружены и сложены пиломатериалы;
- проведены работы по устройству консервационной кровли на верхней части западного ската кубчатой бочки: аккуратно снят верхний слой теса начала 2000-х гг., обследован и частично заменен нижний слой, уложен профнастил, выполнено заземление листов профнастила, изготовлен и установлен городчатый гонт;
- кровли трапезной и крыльца обработаны антисептиком;
- рамы и решетки на окнах покрашены белой краской;
- в интерьере храма проведена уборка, церковная утварь укрыта от загрязнения;
- заведующей сектором реставрации Музея изобразительных искусств Республики Карелия города Петрозаводска Смирновой Марией Федоровной вместе с добровольцами проекта были проведены обмеры, фотофиксация и описание всех элементов сохранившегося иконостаса и церковной утвари.





НЕИЗВЕСТНАЯ ЧАСОВНЯ

1713 г. Вологодская область, Усть-Кубинский р-н, с. Паниха



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- установлены сжимы;
- укреплены журавцы купола;
- изготовлен и установлен крест;
- смонтировано временное завершение (конус из оцинкованного металла) на месте утраченной главы;
- металл купола расчищен от лишайника и покрашен, отверстия загерметизированы;
- на поллицах основного объема установлена консервационная кровля из рубероида;
- защиты досками щели между куполом и полницами;
- смонтированы консервационные кровли над остатками стен крыльца;
- изготовлена и установлена входная дверь;
- проведена уборка;
- расчищена территория и покосена трава вокруг двух часовен, в деревнях Паниха и Горшково.

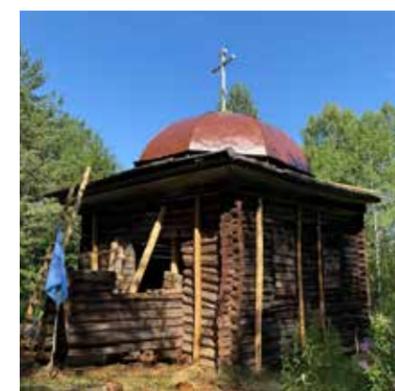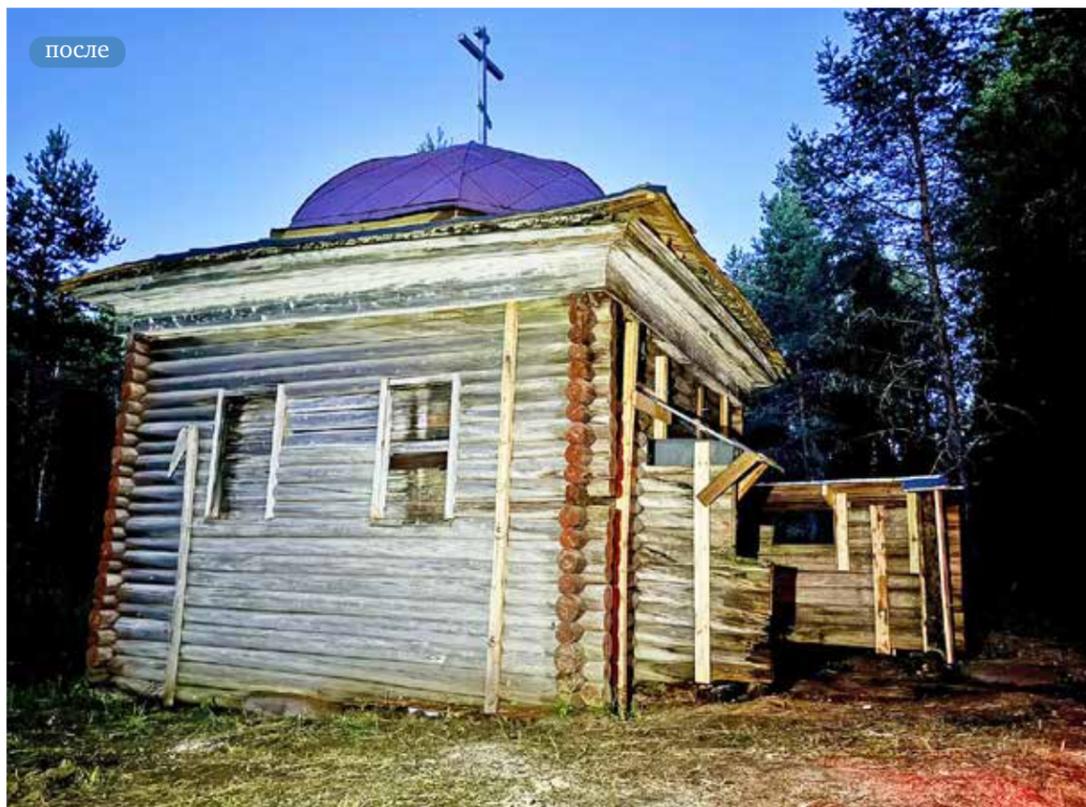

ЧАСОВНЯ СВ. МЧ. ВЛАСИЯ

Республика Карелия, Олонецкий р-н, д. Виллала (Коткозеро)



Работы проведены за один сезон.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- расчищены завалы внутри и вокруг часовни;
- покослена трава, вырублен подлесок, спилены два крупных дерева;
- укреплены конструкции, находящиеся в аварийном состоянии;
- поднят и укреплен просевший угол;
- установлен консервационный навес с защитными фронтонами на самостоятельных опорах,





Дополнительную сложность работ создавало расположение часовни на краю обрыва.



ЧАСОВНЯ ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ

Конец XIX в. Вологодская область,
Верховажский р-н, д. Матвеевская (Фомина Гора)

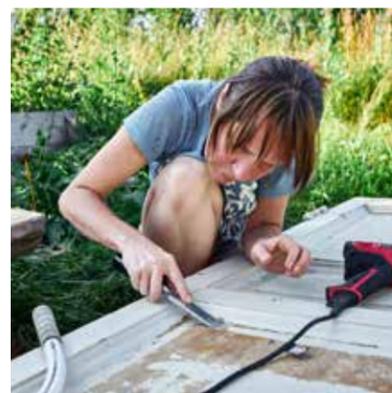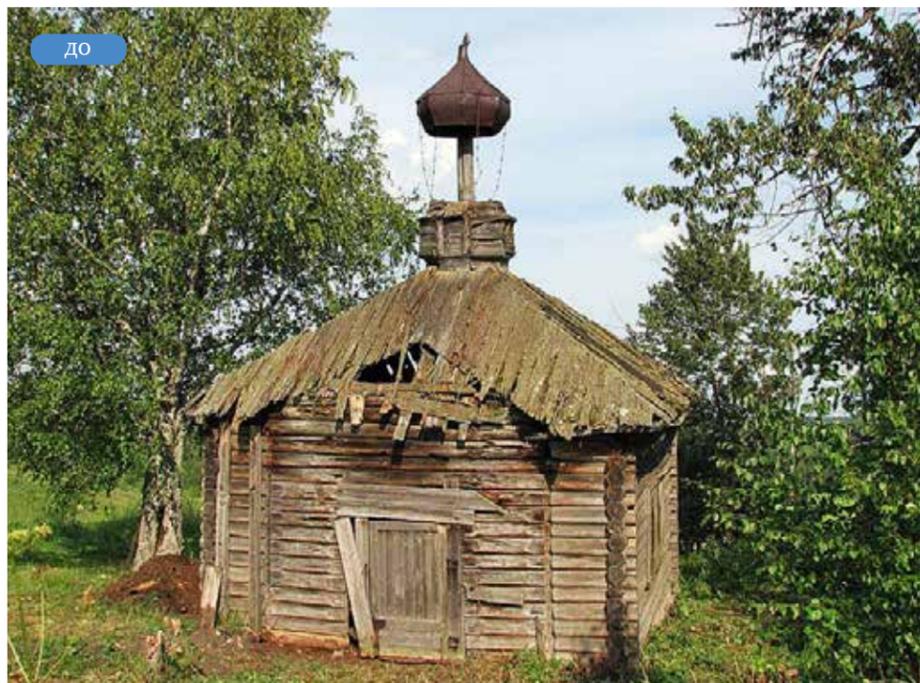

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
– завершено изготовление иконостаса;
– иконостас покрыт левкасом на рыбьем клее;
– продолжена рубка притвора, стены подведены под крышу, вставлена дверная коробка;
– исторические дверные полотна, купленные в Санкт-Петербурге, подготовлены к реставрации: с помощью фена, шпателей и циклей была снята краска;



ЧАСОВНЯ ФЛОРА И ЛАВРА В Д. АФОНИНСКАЯ
– установлена консервационная кровля из баннера;


ЧАСОВНЯ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (ИЛИИ ПРОРОКА) В Д. НОВАЯ
– промаркированы бревна.



Обкошены и убраны часовни в деревнях Удальцовская, Григоровская, Чисть, Костюнинская, Потуловская.


ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1826 г. Архангельская область, Онежский р-н, д. Унежма

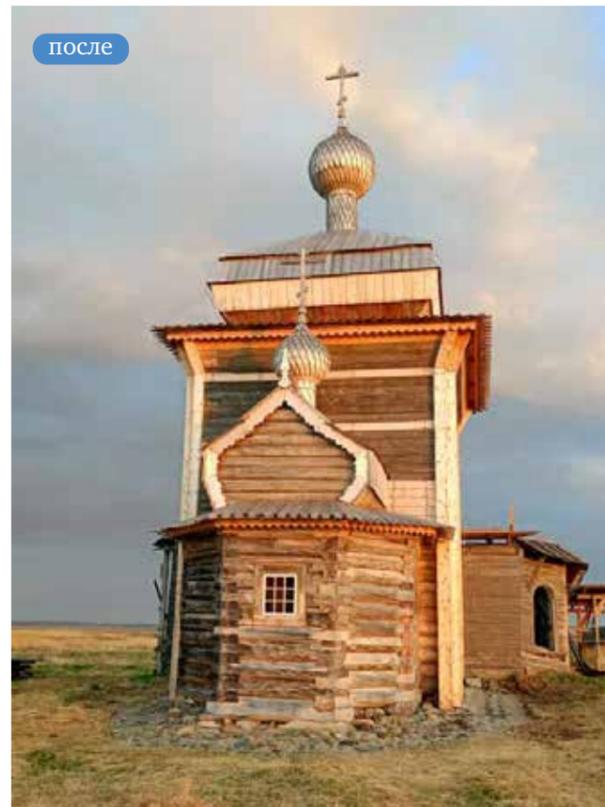

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- Завершена реставрация четверика и алтаря храма.
- устроена отмостка вокруг основного объема и апсиды из камней общим весом около 5 тонн;
- территория очищена от накопившегося в течение шести лет строительного мусора;
- уложены в штабели оставшиеся бревна и доски;
- в отдельный штабель уложены исторические бревна и другие элементы конструкции храма.

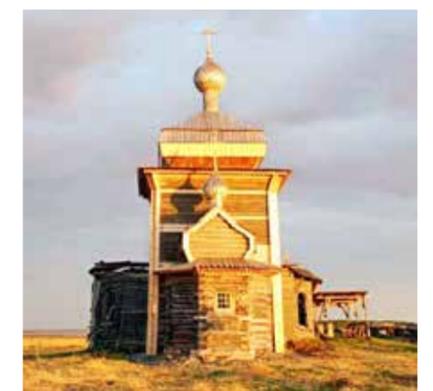

ЧАСОВНЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Кондопожский р-н, Республика Карелия, д. Ерши



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- в основании крыльца заменены сгнившие нижние бревна, а также доски пола, установлена консервационная кровля из профнастила и дороженого теса;
- над основным объемом часовни смонтирована консервационная кровля из профнастила и дороженой доски, установлен, вырубленный из бревна, охлупень;
- на полцы яруса звона изготовлен и уложен красный тес;
- на шатре звонницы заменен сгнивший тес, изготовлены и установлены крест и городчатый лемех на главу, проведен ремонт молниеотвода;
- выпуски бревен сруба защищены досками;
- фундамент расчищен от земли и растительности;
- освобожден от посторонних предметов чердак;
- аккуратно сняты и привезены для ремонта и восстановления в Москву крест и главка основного объема.

ХРАМ ИЛИИ ПРОРОКА

1903 г. Архангельская область, Приморский район, д. Кумбасозеро

до



после



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

в храме Илии Пророка:

- установлена несущая конструкция на месте сгнившего фрагмента северной стены алтаря;
- заменена балка перекрытия;
- демонтирован потолок;
- заменена обшивка восьмерика;
- установлена молниезащита;
- на колоколах временные крепления заменены на кованые хомуты;
- окошена и убрана территория церкви.

в часовне свт. Николая Чудотворца:

- выровнена геометрия сруба;
- установлена консервационная кровля из рубероида;
- заменены нижние венцы;
- настелен пол;
- убрана территория.



НЕИЗВЕСТНАЯ ЧАСОВНЯ XIX в. Костромская обл., Парфеньевский р-н, с. Матвеево

ДО



ПОСЛЕ



Работы проведены за один сезон при активной поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- расчищена территория вокруг часовни;
- проведена планировка земли для отвода воды в дренажную канаву;
- расчищен интерьер часовни, мусор вывезен на свалку;
- укреплены конструкции двух концов;
- смонтированы дублирующие стропила;
- смонтированы леса в интерьере и на южном фасаде;
- в юго-восточном углу установлен сжим по всей высоте сруба;
- смонтирована консервационная кровля: поверх металлической кровли закреплена контробрешетка, на нее сплошная обрешетка, поверх уложены два слоя гидроизола;
- установлен крест;
- расшатавшиеся элементы декора укреплены;
- проведен ремонт двери;
- вновь вводимые элементы конструкций обработаны антисептиком;
- разобрана пристройка советского периода с северной стороны часовни;
- элементы декора и конструкций часовни, которые хранились пристройке, аккуратно сложены в интерьере часовни вместе с неиспользованным материалом.



ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ


1780 г. Архангельская область, Шенкурский р-н, д. Литвиново



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:


- на нижнем ярусе колокольни и в трапезной настелены полы;
- на четверике основного объема и на апсиде поверх исторической металлической кровли установлена консервационная – из ондулина;
- разобраны неиспользуемые строительные леса на южном фасаде храма;
- на колокольне установлены леса до полиц нижнего четверика;
- выполнен локальный временный ремонт полиц колокольни;
- обеспечен доступ к аварийным конструкциям колокольни для их дальнейшего обследования.

В конце экспедиции настоятель храма свв. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких г. Шенкурск протоиерей Стефан Яремчук, отслужил благодарственный молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

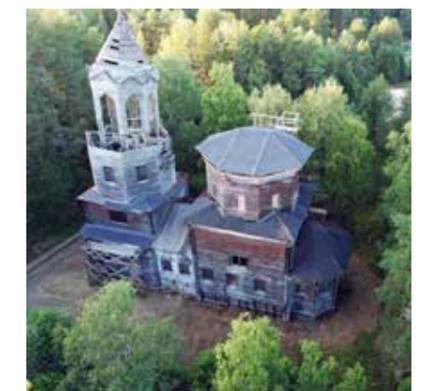

ХРАМ ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

1896 г. Республика Татарстан, Пестречинский р-н,
с. Русское Ходяшево

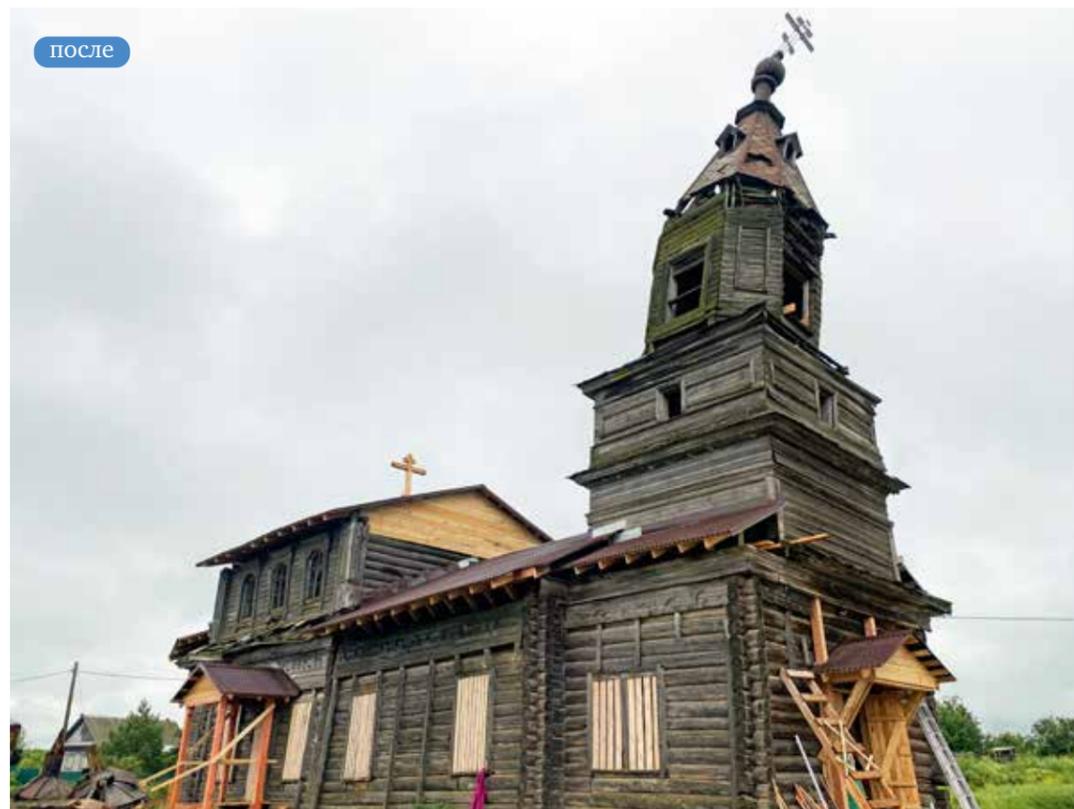

Работы проводились при поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- в трапезной расчищены завалы, установлена консервационная кровля на самостоятельных опорах, уложены полы;
- на колокольне смонтирована страховочная конструкция для дальнейших работ по разбору двух верхних ярусов, укреплен угол сруба на третьем ярусе, на поллицах установлена консервационная кровля, на нижнем ярусе уложены полы;
- выровнена южная стена основного четверика;
- построены два крыльца;
- обработано антисептиком 15 кубометров пиломатериала;
- по периметру храма выложена каменная отмостка.

15 июня иереем Дмитрием Николаевым, командиром экспедиции, была отслужена Божественная литургия.



ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 1605 г. Архангельская область, Пинежский р-н, д. Сояла



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- все необходимые материалы переправлены через реку;
- расчищены стены от мха и грибка, а чердак притвора от мусора и птичьего помета;
- смонтирована консервационная кровля над центральной частью восьмерика: установлены опорные конструкции высотой около десяти метров, смонтированы стропила, уложена обрешетка и ондулин;
- взяты керны из бревен сруба для проведения дендрохронологического анализа и уточнения даты постройки церкви.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

1906 г. Псковская область, Плюсский р-н, с. Петрилово




Работы проводились при поддержке местных жителей, весь запланированный объем работ выполнен за один сезон

- ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:**
- расчищена территория храма, в т.ч. от больших деревьев;
 - разобраны завалы, мусор вывезен на телегах;
 - установлена консервационная кровля на независимых опорах с использованием листов одулина;
 - храм подготовлен к богослужению.



Митрополитом Псковским и Порховским Матфеем и митрополитом Звенигородским Арсением была отслужена первая за последние 100 лет Божественная литургия.

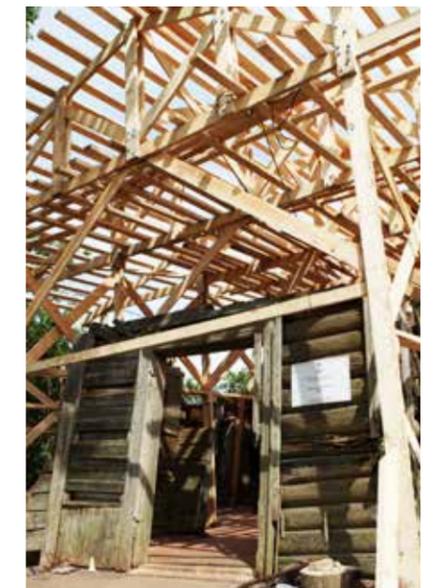

ХРАМ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛ ПЕТРА И ПАВЛА 1620 г. Республика Карелия, Кондопожский р-н, остров Лычный



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- возведены леса на шатре колокольни до уровня главки, после работ верхние ярусы демонтированы;
- подготовлены доски для консервационной кровли: отстроганы, продорожены и обработаны антисептиком;
- установлена консервационная кровля на шатре колокольни: расчищен существующий тес, смонтирована обрешетка, уложен гидроизол, установлена дороженная доска;
- в храме проведена уборка;
- устроены завесы на Царских и дьяконских вратах.

9 августа иереем Олегом Червяковым была отслужена Божественная литургия.




ХРАМ ПРЕП. АНТОНИЯ СИЙСКОГО

1799 г. Архангельская область, Приморский р-н,
д. Нижняя Золотица



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- демонтированы: отделка стен и потолок вторая пол. XX в. – нач. XXI в. (гипсокартон, вагонка), поздние перегородки;
- установлены четыре колонны под потолочные балки трапезной;
- устроены полы: демонтированы полы в аварийном состоянии, расчищено подпольное пространство, установлены столбчатые основания, уложены балки, настелена доска;
- в окна вставлены стекла и поликарбонат, восстановлены утраченные откосы;
- пошиты катапетасма и облачения на престол, жертвенник и аналои;
- отпечатаны на дереве и установлены в иконостас копии древних икон: Спаситель, Богородица, Прп. Антоний Сийский;
- привезены три аналоя и центральный подсвечник;
- местной жительницей возвращена в храм икона Богородицы.

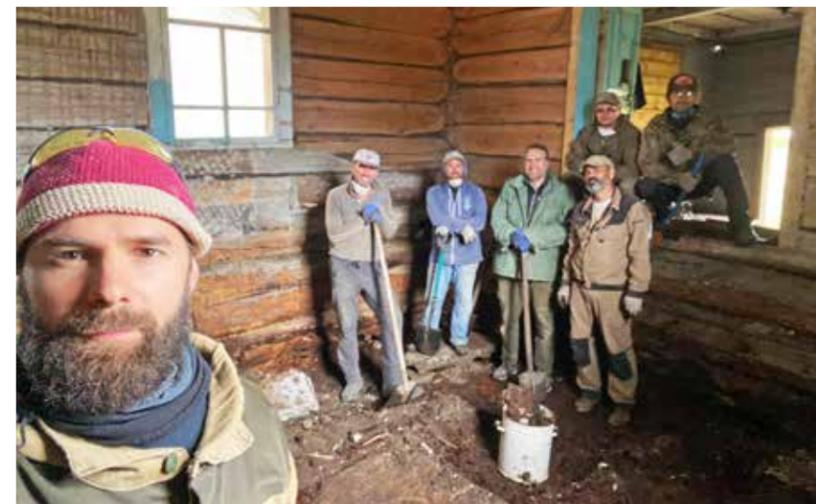

В воскресный день и в праздник Успения Божией Матери иереем Дмитрием Николаевым, командиром экспедиции, были отслужены Божественные литургии.



ЧАСОВНЯ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

XVIII в. Республика Коми, Удорский р-н, д. Чернутьево



Работы выполнены за один сезон.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проведены подготовительные работы: убран мусор, разобраны стеллажи, расчищен погреб, раскрыты оконные проемы;
- заменены сгнившие бревна и следи;
- установлена консервационная кровля из ондулина: демонтирован шифер и сгнивший тес, укреплены или заменены аварийные подкровельные конструкции, уложена обрешетка и ондулин;
- изготовлены и установлены два креста: на основном объеме и в интерьере часовни;
- установлены сжимы;
- отремонтированы полы;
- пиломатериалы обработаны антисептиком;
- оконные проемы закрыты пленкой;
- отремонтированы двери;
- убрана территория, оставшийся материал сложен в притворе;
- изготовлена церковная утварь.

После завершения работ часовня была освящена протоиереем Игорем Светличным.

ЧАСОВНЯ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (ИЛИИ ПРОРОКА)

1799 г. Вологодская область, Верховажский р-н, д. Новая



до



после



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- промаркированы бревна и другие подлинные элементы;
- построен ангар для хранения деталей часовни;
- устроена пилорама для обработки бревен на месте.

Перед началом работ клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в с. Верховажье, иереем Евгением Коротиним, был отслужен водосвятный молебен.



ХРАМ БЛГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 1725 г. Архангельская область, Плесецкий р-н, д. Пустынька

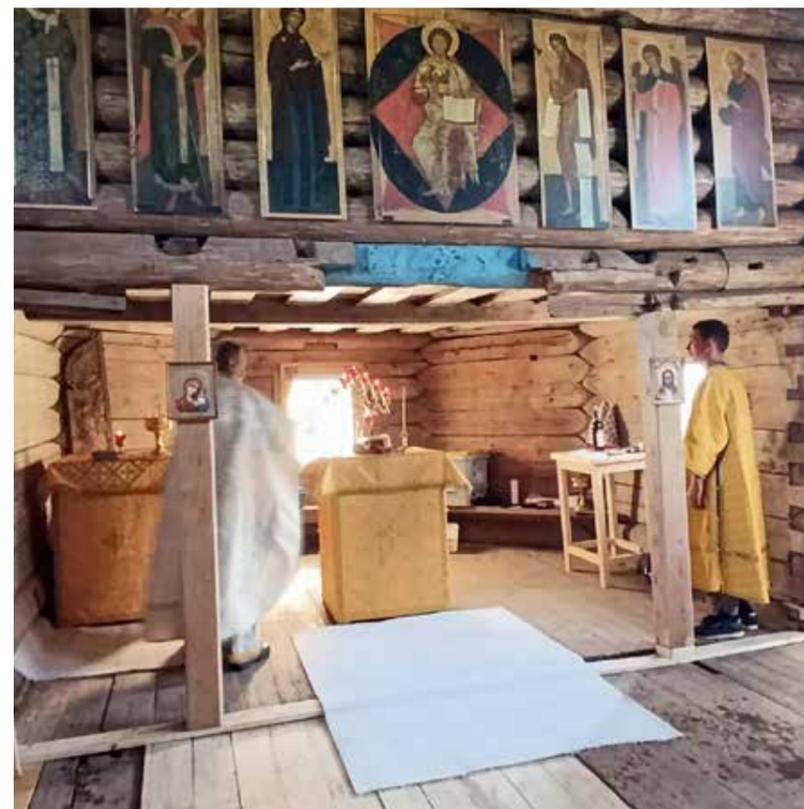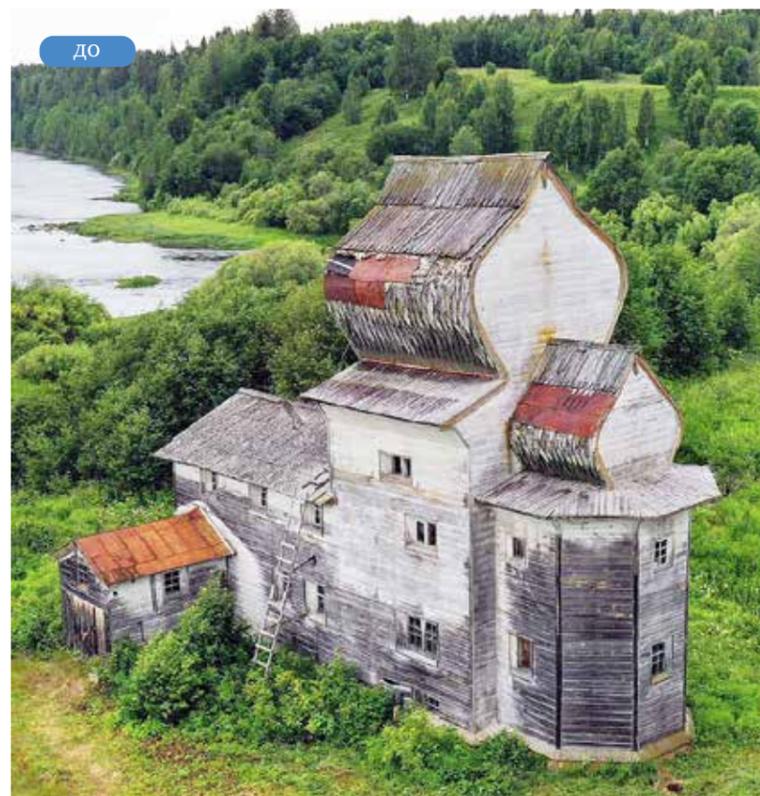

Работы проведены за один сезон при активной поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- территория расчищена от зарослей, выполнен дренаж;
- установлены и, после проведения работ, демонтированы леса на бочке над основным объемом и на южном фасаде трапезной;
- с помощью домкратов поднят северо-западный угол храма;
- заменены сгнившие нижние венцы;
- с помощью тросов выровнена и укреплена бочка над основным объемом;
- усилены и частично заменены слги бочек;
- смонтирована консервационная кровля на обеих бочках и трапезной: укреплено основание, там, где это было необходимо, установлена обрешетка, уложен ондулин;
- установлен крест на алтарной бочке и главка на основной;
- покрашена металлическая кровля крыльца;
- восстановлен отлив цоколя;
- разбитые окна закрыты поликарбонатом,
- перебран пол в алтаре верхнего храма,
- построен навес для хранения сохранившихся исторических элементов и остатков стройматериалов;
- установлен информационный стенд;
- изготовлены престол и жертвенник, повешены иконы, храм подготовлен к службе.

В последний день экспедиции благочинный Плесецкого благочиния иеромонах Антоний (Ласточкин) и настоятель кафедрального собора апостола Иоанна Богослова пгт. Плесеца протоиерей Глеб Должиков отслужили Божественную Литургию.

ЧАСОВНЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

1731 г. Архангельская область, Холмогорский р-н, п. Часовня



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- продолжены работы по реставрации бревен сруба галереи;
- отреставрированы и установлены дверные косяки;
- начата реставрация оконных косяков;
- отреставрирован пол в галерее: установлены балки пола исторические и новые, взамен утраченных, уложены доски пола, в т.ч. новые, которые предварительно были остроганы и окрошены.




ХРАМ ИЛИИ ПРОРОКА XIX в. Республика Карелия, Кемский р-н, д. Панозеро



- ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:**
- проведены обмеры, фотофиксация и обследование храма;
 - расчищена территория вокруг храма;
 - установлены страховочные (разгрузочные) конструкции в основном объеме;
 - со стен внутри основного объема и трапезной демонтирован гипсокартон;
 - чердачное пространство основного объема и трапезной расчищено от засыпки и мусора;
 - выполнен временный (до следующего сезона) локальный ремонт на южном скате основного объема: демонтирован ветхий рубероид, выровнена и укреплена одна из слег, уложены два слоя досок и толь между ними;
 - устранены локальные протечки в существующей кровле;
 - установлена секция строительных лесов на южном фасаде;
 - смонтирована площадка перед входной дверью;
 - неиспользованный материал перенесен и сложен в интерьер храма.

ЧАСОВНЯ СОРОКА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ 1842 г. Тверская область, Кашинский р-н, д. Слободка

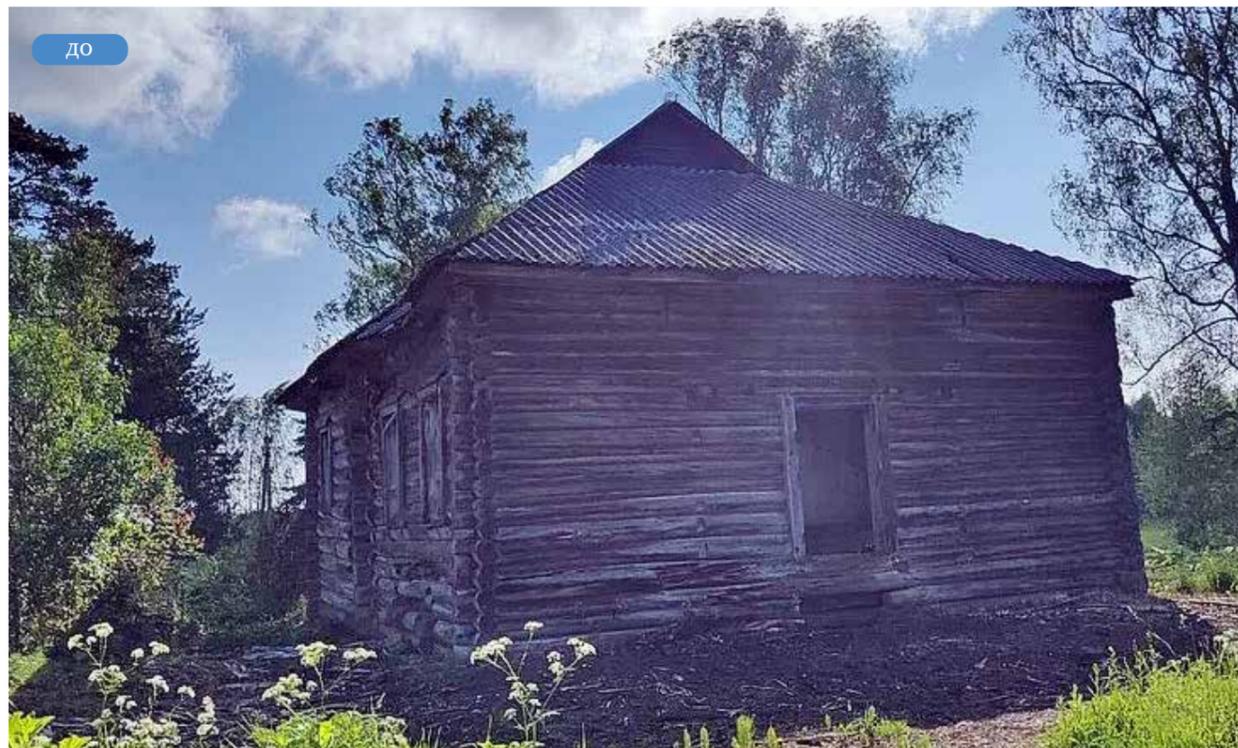

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проведены обмеры и исследование храма;
- территория и интерьер храма расчищены от мусора и растительности, почва обработана специальными гербицидами от борщевика;
- устроен склад для оборудования, завезены строительные материалы;
- оштукатуренные стены алтаря расчищены от надписей и покрашены краской;
- разобран сгнивший, частично упавший, юго-восточный угол кровли трапезной, на его месте установлена консервационная кровля: смонтированы новые стропила и обрешетка, уложены листы ондулина;
- на месте сгнившего верхнего венца выполнены временные вставки из бруса;
- проведены локальные ремонтные работы кровли: заменены треснувшие листы шифера, закреплены незафиксированные, герметизированы стыки скатов;
- проведены работы по укреплению пола из плах: удалены полностью сгнившие части бревен черного пола и плах, выровнено локальное провисание конструкций, установлены дополнительные лаги, уложена доска;
- устроено временное крыльцо;
- изготовлена и установлена утраченная створка входной двустворчатой двери;
- оконные и часть дверных проемов закрыты поликарбонатом.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1741 г. Костромская область, Сусанинский р-н, с. Андреевское



Работы проводились при активной поддержке местных жителей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- продолжены работы по установке консервационной кровли трапезной: усилен опорный каркас, установлены лестницы для выхода на верхний ярус подкровельных конструкций и рабочий настил для работы, установлены стропильная система и обрешетка, уложен ондулин;
- разобраны леса с северной и восточной стороны трапезной;
- на восточной половине южной стены были сняты обшивка и элементы грозящие обрушением, установлен односторонний составной сжим;
- установлены консервационные кровельки над остатками кирпичных столбов-оснований галереи у южной, западной и северной стен четверика;
- изготовлены щиты для накрывания складированных элементов конструкций полов трапезной;
- элементы конструкций обработаны огнебиозащитным составом;
- оконные проемы в трапезной закрыты пленкой;
- проведено обследование фресок в интерьере: выполнены кроки и фотофиксация, отобраны пробы.





СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ:

Губернатора Архангельской области Цыбульского Александра Витальевича
Министерство Культуры Российской Федерации
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области
Русское географическое общество
Компанию ООО «СТОМШОП»
Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области
Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества им. В.С.Рахманова
Музей-заповедник «Кижы»
АНО «Традиция»
Компанию «Ондулин. Легкие кровельные системы»
Благотворительный фонд «Северный духовный путь»
ООО «ТихвинПроектРеставрация»
АРЦ «Заонежье»
ООО «Архрест Проект»



НАШ АДРЕС:

127224, г. Москва,
проезд Шокальского, 48

e-mail: info@obsheedelo.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Настоятель храма в честь
преп. Серафима Саровского
в Раеве г. Москвы
протоиерей Алексей Яковлев

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:

Корчинова Лидия Сергеевна
тел.: +7-926-729-42-49

Шалохманов Максим
Александрович
тел.: +7-916-205-28-80

Смирнов Павел Александрович
тел.: +7-977-809-26-01

ТОЛЬКО ВОЗРОЖДАЯ
СВЯТЫНИ ПРОШЛОГО,
МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ
НА ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ.



www.obsheedelo.ru

