Общее дело

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ СЕВЕРА

www.obsheedelo.ru

ЭКСПЕДИЦИИ

2024

ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ СЕВЕРА» объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить древние святыни Православия и памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тверской, Костромской областях, республиках Коми и Карелия.

До сих пор на Русском Севере можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В годы советской власти огромное число храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады, оставалось в запустении. Нам выпала честь найти эти храмы, сохранить и передать потомкам. В первую очередь важно провести противоаварийные работы: отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. Если не сделать этого сейчас, многие деревянные святыни скоро разрушатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов.

Начало проекта было положено 75-летним Дедушкой Александром Порфирьевичем Слепининым в поморской деревне Ворзогоры. На свои средства он стал перекрывать крышу колокольни. Узнав о добром начинании, ему стали помогать прихожане московских храмов. В наши дни Проект осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За восемнадцать лет существования проекта было проведено 620 экспедиций, в ходе которых обследовано более 360 храмов и часовен; в 192 из них проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы.

В 2024 году состоялось 68 экспедиций, в которых приняло участие более 800 добровольцев из разных регионов России. Работы проводились в 37 храмах и часовнях на Русском Севере. В 12 храмах были отслужены Божественные литургии, в 4 из них – впервые с момента закрытия храмов.

ЭКСПЕДИЦИИ
АНДРЕЕВСКОЕ -1,2
ТРУДОВАЯ

24.06.2024 – 30.06.2024
30.06.2024 – 07.07.2024

Командир: Назаров
Михаил Константинович

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1741 г. *Костромская область, Сусанинский район, с. Андреевское*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– установлены стойки для дальнейшего монтажа консервационной кровли над трапезной церкви;
– северная часть основного молельного четверика расчищена от завалов и грунта;
– обнаруженные в завалах сохранившиеся фрагменты конструкций и декора складированы, выполнены их обмеры и фотофиксация;
– расчищена и перемещена для сохранения главка, находившаяся в завалах;
– столбчатые основания утраченной галереи защищены консервационными колпаками;
– западная стена алтарной части укреплена подпорными столбами;
– сооружены подмостки для складирования элементов от разрушенных конструкций гульбища;
– выполнен план прилегающей к церкви территории.

ЭКСПЕДИЦИЯ
БАБИНСКАЯ
ТРУДОВАЯ

20.07.2024 – 28.07.2024

Командир: Китайгородская Анна Борисовна

ЧАСОВНЯ СВ. МЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ

Середина XIX в. *Вологодская область, Вытегорский район, ур. Бабинская (Каменное, Шимозеро)*

до

после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– доставлены строительные материалы для консервационных работ;
– территория вокруг часовни расчищена от травы и кустарника;
– проведена уборка мусора в часовне, изготовлен аналой и размещены иконы;
– выровнена геометрия сруба часовни;
– укреплены частично нарушенные элементы конструкций (нижние и верхние венцы, самцы и слеги);
– на южном скате крыши смонтирована консервационная кровля с покрытием дороженым тесом;
– восстановлены утраченные элементы креста.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ВАРЖА
ТРУДОВАЯ

29.06.2024 – 07.07.2024

Командир: Бакшанский Владислав Дмитриевич

ЧАСОВНЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1877 г. *Кировская область, Лузский район, д. Варжа (Кузьминская)*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– осуществлен покос травы по периметру часовни;
– демонтированы остатки рухнувшей кровли трапезной, сохранившиеся элементы стропил и плах пола закреплены на исторических местах;
– целые элементы конструкций, обнаруженные в завалах, складированы в подклете и притворе часовни;
– над трапезной смонтирована двускатная консервационная кровля на независимом каркасе;
– устранены повреждения и протечки металлической кровли на крыше основного четверика;
– на западном фасаде закреплены на историческом месте нарушенные детали карниза, расчищен водосточный желоб, обновлены щиты на окнах;
– закрыты досками утраченные участки обшивки барабана основного четверика.

ЭКСПЕДИЦИЯ
КОСТИНА ГОРА
ТРУДОВАЯ

08.05.2024 – 12.05.2024

Командир: Николаев Дмитрий Александрович

ЧАСОВНЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Конец XIX в. *Республика Карелия, Пудожский район, д. Костина Гора*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– проведена уборка листвы и мусора вокруг и внутри часовни;
– на дороге установлены указатели по направлению к часовне;
– зашит досками западный фронтон;
– рухнувший восточный фронтон складирован у восточной стены часовни.

ЭКСПЕДИЦИЯ
КРЕНИЦЫ
ТРУДОВАЯ

21.07.2024 – 28.07.2024

Командир: Николаев Дмитрий Александрович

ЧАСОВНЯ ИЛИИ ПРОРОКА

Дата постройки неизвестна. *Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Креницы*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– территория вокруг часовни расчищена от мусора;
– часовня расчищена от песка и мусора;
– установлены временные строительные леса;
– установлены опоры для монтажа консервационной кровли, укреплена существующая стропильная система, смонтирована разряженная обрешетка под ондулин;
– изготовлена и установлена входная дверь;
– команда экспедиции совместно с представителями АНО «Николаевский проспект» приняла участие в съемках для местного ТВ.

ЭКСПЕДИЦИИ	08.06.2024 - 16.06.2024	Командир: Китайгородская
КУЖБАЛ–1,2,3	15.06.2024 - 23.06.2024	Анна Борисовна
ТРУДОВЫЕ	21.09.2024 - 29.09.2024	

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО

1762 г. *Костромская область, Нейский район, с. Кужбал*

до

после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– завершена установка каркаса для устройства стропильной системы кровли;
– изготовлен, освящен и установлен крест на основном объеме;
– на основном объеме установлены стропила;
– на участке по оси храма и в приделе настелены полы, по периметру полов установлено ограждение;
– организовано место для моления в приделе – изготовлены полочка, временный иконостас и аналой;
– половина окон закрыта поликарбонатом;
– продолжена фиксация подлинных деталей;
– установлен информационный стенд;
– укреплен аварийный дверной проем в соседнем руинированном кирпичном храме Рождества Богородицы;
– дети помогли покрасить забор кужбальского детского сада.

26 сентября, в престольный праздник храма – память Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение Словущее), был установлен крест и отслужена первая после закрытия Божественная литургия!

ЭКСПЕДИЦИЯ
ОЛЬКОВО
ТРУДОВАЯ

03.06.2024 - 12.06.2024

Командир: Священник Дмитрий Николаев

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

1862 г. *Вологодская область, Вытегорский район, д. Ольково*

до

после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– частично демонтирован верхний слой теса на основном объеме, установлена обрешетка;
– установлены консервационные кровли с использованием листов ондулина;
– изготовлен, освящен и установлен крест на основном объеме;
– установлены 12 сжимов и подкосов;
– установлены горизонтальные связи между сжимами в интерьере храма, связи одновременно являются противоаварийной конструкцией для проседающего потолка;
– над трапезной и притвором храма с установлена независимая двускатная консервационная кровля использованием листов ондулина;
– изготовлена и установлена входная дверь;
– изготовлены и установлены щиты на окна;
– установлена молниезащита;
– подлинные детали конструкций и декора сложены в храме.

В воскресенье, 9 июня, была отслужена Божественная Литургия.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПАНИХА-ГОРШКОВО
ТРУДОВАЯ

20.07.2024 – 28.07.2024

Командир: Яньков Дмитрий Геннадьевич

ЧАСОВНЯ ВМЧ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

Дата постройки неизвестна. *Вологодская область, Усть-Кубенский район, д. Паниха*

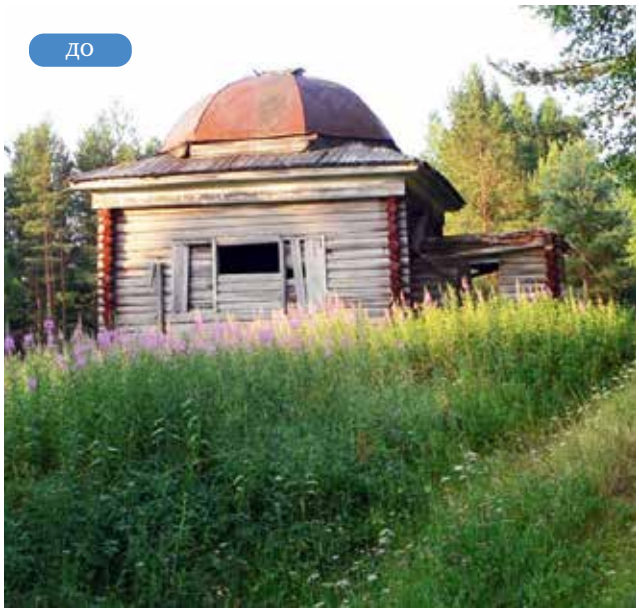

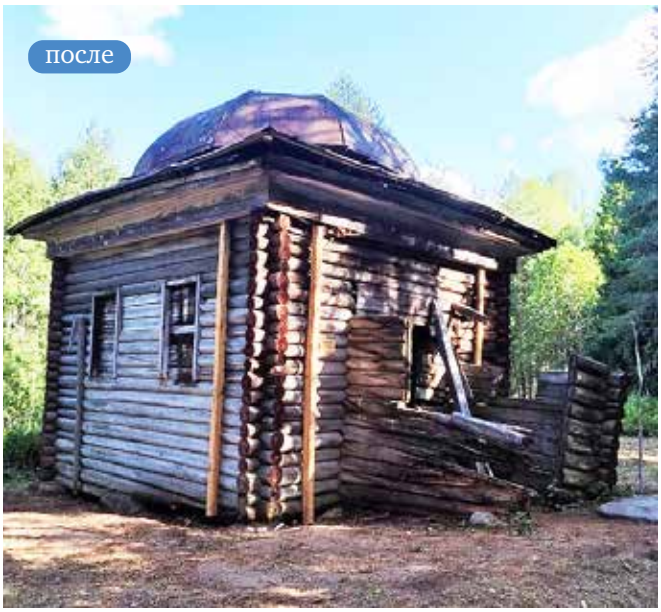

ЧАСОВНЯ ИОАННА БОГОСЛОВА

Дата постройки неизвестна. *Вологодская область, Усть-Кубенский район, д. Горшково*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: ЧАСОВНЯ ВМЧ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ (ПАНИХА)

– территория вокруг часовни расчищена от травы и кустарника;
– валуны в основании часовни расчищены от грунта, устроен водоотвод;
– стены часовни укреплены стяжками;
– ослабленные балки укреплены столбами;
– укреплены журавцы купола;
– смонтировано консервационное покрытие на полицах часовни;
– оконные проемы закрыты дощатыми щитами.

ЧАСОВНЯ ИОАННА БОГОСЛОВА (ГОРШКОВО)

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– металлические кровли часовни покрыты вторым слоем краски по ржавчине;
– демонтированы временные строительные леса.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПУКШЕНЬГА
ТРУДОВАЯ

06.07.2024 – 13.07.2024

Командир: Сливяк Василий Владимирович

ЧАСОВНЯ ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

1717 г. *Архангельская область, Холмогорский район, д. Пукшеньга*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– осуществлен покос травы по периметру часовни;
– водоотводящие канавки расчищены от листвы и мусора;
– прочищены продухи фундамента;
– смонтировано консервационное покрытие из ондулина на кровле часовни.

ЭКСПЕДИЦИИ
КАДЬ–1, 2, 3, 4
ТРУДОВЫЕ

09.02.2024–12.02.2024
15.06.2024–23.06.2024
23.06.2024–01.07.2024
30.07.2024–06.08.2024

Командир: Серебряков Роман Александрович

ЦЕРКОВЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

1901 г. *Архангельская область, Приморский район, д. Кадь*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– на всех объемах храма установлены консервационные кровли, где необходимо, были усилены или продублированы подкровельные конструкции;
– во всем храме установлены полы;
– на северном фасаде основного объема установлены подкосы;
– восстановлено крыльцо;
– организованы вентиляционные продухи;
– укреплен дверной проем, изготовлена и установлена двустворчатая дверь
– взамен утраченной установлена обшивка;
– произведен ремонт лестницы на ярус звона;
– установлены светопрозрачное заполнение в окнах храма и щиты в окна и проемы колокольни;
– смыты вандальные надписи на стенах и потолках;
– выровнены сохранившиеся конструкции иконостаса;
– подлинные детали сложены в храме;
– окошена прилегающая к храму территория;
– храм подготовлен к проведению Литургии: собраны и установлены привезенные престол и жертвенник, иконы установлены на Горнем месте и в иконостасе.

30 июня 2024г. была отслужена первая за 105 лет Божественная литургия.

ЭКСПЕДИЦИИ
ВИННИЦЫ–1, 2
ТРУДОВЫЕ

15.06.2024–25.06.2024
25.06.2024–03.07.2024

Командиры: Аликулов Руслан Бакытбекович, Священник Борис Осипов

ХРАМ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

1871 г. *Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– на шести из восьми скатах кровли смонтировано консервационное покрытие из ондулина по разряженной обрешетке, свесы кровли укреплены;
– герметизация основания креста в центре;
– демонтаж лестницы;
– вывоз мусора.

ЭКСПЕДИЦИИ
КОЗЛЫ–1, 2, 3
ТРУДОВЫЕ

15.06.2024–25.06.2024
10.08.2024–18.08.2024
17.08.2024–25.08.2024

Командиры: Проненков Дмитрий Евгеньевич, Баринов Алексей Владимирович

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1915 г. *Архангельская область, Приморский район, д. Козлы*

до

после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– доставлены материалы;
– укреплены, продублированы и частично демонтированы аварийные конструкции;
– установлены консервационные кровли на всех объемах;
– на основном объеме установлен крест;
– перебран аварийный участок пола, устроены временные полы в алтаре, основном четверике, трапезной;
– закрыты щитами оконные проемы, утратившие заполнения;
– установлена дверь;
– устроена временная лестница;
– стены очищены от надписей и загрязнений;
– повешены иконы;
– убраны храм и территория вокруг него;
– остатки материалов сложены в храме;
– проведены дополнительные обмеры и исследования храма.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛАСТА
ТРУДОВАЯ

01.07.2024–06.07.2024

Командир: Прохоров Роман Викторович

ХРАМ ЦЕРКОВЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

1869 г. Республика Коми, Ижемский район, с. Ласта

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– монтаж консервационного покрытия из сплошной дощатой обрешетки с покрытием гидростеклоизолом на куполе колокольни;
– монтаж консервационного покрытия из гидростеклоизола на полицах колокольни;
– подкупольное пространство расчищено от гумуса и мусора.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛЫЧНЫЙ ОСТРОВ
ТРУДОВАЯ

27.07.2024 – 10.08.2024

Командир: Фоминов Григорий Викторович

ХРАМ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

1620 г. *Республика Карелия, Кондопожский район, остров Лычный*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– проведена уборка в храме;
– установлены противоаварийные опоры под балки потолка;
– смонтирована консервационная кровля из профилированных металлических листов и дороженой доски над крыльцом, трапезной и алтарной частями храма;
– смонтирована наружная дощатая обшивка на алтарной части храма;
– священником Олегом Червяковым отслужена Божественная Литургия. На службе собрались участники экспедиции, жители острова и близлежащих деревень, а также паломники из Петрозаводска, Медвежьегорска и с Водлозера.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПЯЛЬМА
ТРУДОВАЯ

27.07.2024 – 11.08.2024

Командир: Бердяга
Елена Анатольевна

ЧАСОВНЯ ИЛИИ ПРОРОКА

Приблизительно 1800–1850 гг. *Республика Карелия, Пудожский район, д. Пяльма*

до

после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– выровнена геометрия часовни, укреплен валунный фундамент;
– смонтирована кровля из дороженого теса на основном объеме и шатре звонницы;
– смонтирована кровля из дороженого красного теса на полицах шатра, на уровне звона и на крыльце;
– заменен шелом, установлены кресты на главках основного объема и шатра звонницы;
– изготовлен и установлен лемех (270 шт) на главках часовни;
– установлены четыре оконных рамы с отливами;
– установлены причелины и полотенца на месте утраченных.
– сруб обработан защитным составом от паразитов.

ЭКСПЕДИЦИЯ
МАГАДАН
РАЗВЕДКА

11.07.2024–18.07.2024

Командир: Смирнов
Павел Александрович

БЫВШИЙ ЛАГЕРЬ «ДНЕПРОВСКИЙ»

Магаданская область, Хасынский район, ур. Днепровский

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– проведено обследование текущего состояния объектов: рудосортировка, дом с росписями, пост охраны, дом рядом с копером (вышкой);
– выполнены обмеры и фотофиксация.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ШУНЬГСКАЯ ГУБА
ТРУДОВАЯ

27.07.2024 – 11.08.2024

Командир: священник Петр Гвоздев

ЧАСОВНЯ СВЩМ. АНТИПЫ ПЕРГАМСКОГО

1775 г. *Республика Карелия, Медвежьегорский район, ур. Шуньгская Губа*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– территория вокруг часовни расчищена от кустарника;
– укреплена опорная балка столбов с южной стороны звонницы;
– смонтирована консервационная кровля на шатре и полицах звонницы;
– на шатре звонницы установлен крест;
– поврежденные участки металлического покрытия главки и креста обработаны мастикой и покрыты антикоррозионной краской.

ЭКСПЕДИЦИЯ
КУВАКА
РАЗВЕДКА

27.07.2024 – 11.08.2024

Командир: Пирогова
Нина Александровна

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Не ранее 1895 г. *Пензенская область, Каменский район, с. Кувака*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
– территория вокруг церкви расчищена от кустарника;
– выполнена фотофиксация;
– выполнены обмерные чертежи.

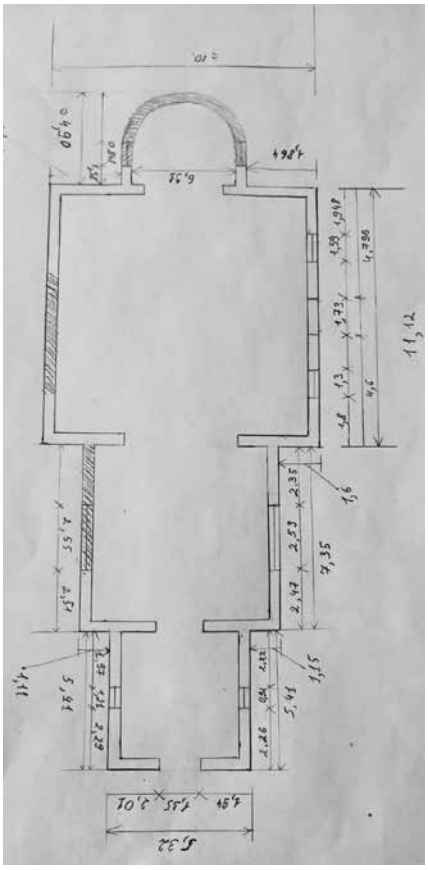

ЭКСПЕДИЦИЯ
КУМБАСОЗЕРО
ТРУДОВАЯ

04.08.2024–11.08.2024

Командир:
Беляев Дмитрий Борисович

ХРАМ ИЛИИ ПРОРОКА

Архангельская область, Приморский район, д. Кумбасозеро

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– выполнены полицы шатра;
– завершена отделка основания центральной главки и основного объёма храма;
– уборка мусора внутри храма;
– вынута часть грунта из храма;
– устройство чернового пола по всей площади храма;
– проведена разведка часовни Николая Чудотворца в близлежащем лесу.

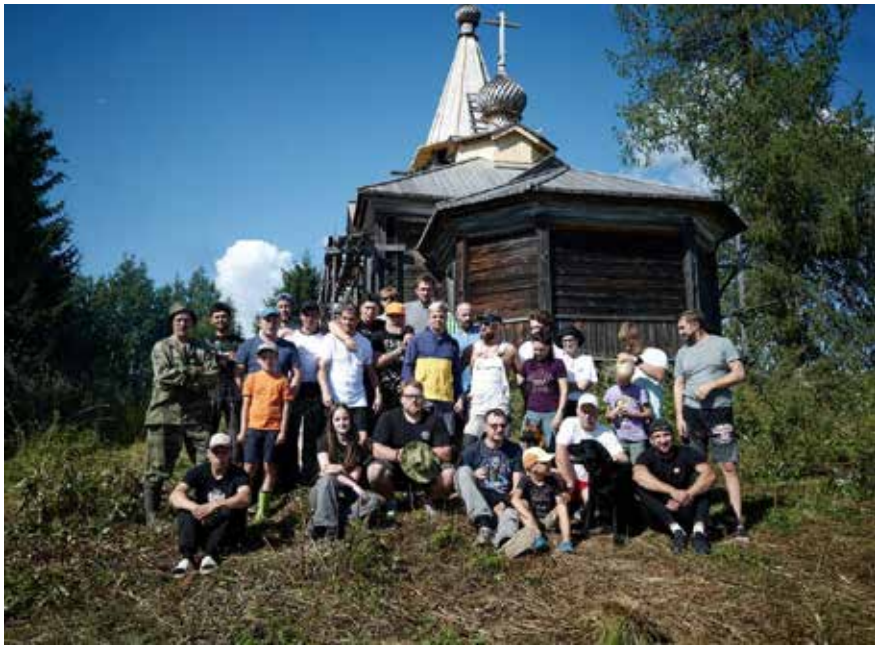

ЭКСПЕДИЦИЯ
РУССКОЕ ХОДЯШЕВО
ТРУДОВАЯ

21.08.2024 – 29.08.2024

Командир: Священник Дмитрий Николаев

ХРАМ ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

1896 г. *Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Русское Ходяшево*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– покошена трава;
– вынесены из храма мусор, упавшая кровля, выросшие деревья, сгнившие полы из алтаря и основного четверика;
– для возведения кровли установлены 22 колонны высотой до 8 метров;
– на алтарной части и основном объеме установлены: стропильная система, обрешетка, уложен ондулин;
– установлены щиты на окна;
– изготовлены и установлены две двери;
– установлены полы в алтаре и основном четверике;
– изготовлен и установлен крест, отслужен молебен и совершен чин освящения креста;
– установлена молниезащита;
– установлен иконостас, престол и жертвенник.

28 августа в праздник Успения Божией Матери впервые за много лет была совершена Божественная литургия!

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛИТВИНОВО
ТРУДОВАЯ

07.08.2024 – 18.08.2024

Командир:
Рыбин Иван Сергеевич

ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

1780 г. *Архангельская область, Шенкурский район, д. Литвиново*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– сооружена стропильная конструкция с опорой на силовые леса над основным объёмом храма;
– выполнена кровля из ондулина по разряженной обрешетке над основным объёмом храма;
– сооружены временные леса с южной стороны колокольни (на высоту 12 метров);
– выполнена дублирующая кровля из ондулина на южных полицах колокольни (без демонтажа исторической кровли);
– изготовлены и установлены щиты на окна;
– выполнена подшивка подкровельного пространства на месте утраченных венцов повала.

ЭКСПЕДИЦИИ
КОНИ–1, 2
ТРУДОВЫЕ

07.08.2024 – 15.08.2024
14.09.2024 – 22.09.2024

Командиры: Курьянов Алексей Николаевич, Дзисько Александра Михайловна

ЧАСОВНЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Вторая половина XIX в. *Республика Коми, Княжпогостский район, д. Кони*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– установлены леса на северном фасаде основного объема;
– после маркировки элементов звонница была разобрана, детали частично очищены от грязи и биопоражений, обработаны антисептиком, сложены на специально установленный настил, над деталями установлен навес;
– установлены упоры под западную стену четверика;
– под стенами притвора устроены продухи.

ЭКСПЕДИЦИИ
МОШЬЮГА–1, 2
ТРУДОВЫЕ

15.03.2024 – 24.03.2024
07.07.2024 – 13.07.2024

Командир: Прохоров
Роман Викторович

КОЛОКОЛЬНЯ ХРАМА СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1884 г. *Республика Коми, Ижемский район, с. Мошьюга*

до

после

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– простроганы и продорожены доски для пола и полиц;
– укреплены конструкции самого купола и места опирания его несущих конструкций;
– завершены работы по устройству консервационной кровли на куполе с использованием стеклоизола, часть люкарн покрыты сохранившимися оригинальными листами железа;
– установлена консервационная кровля на полицах третьего яруса;
– установлены новые балясины на втором ярусе с восточной и западной стороны;
– настелен пол в одном из помещений первого яруса
– проведены фотофиксация и обмеры тумб.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПУРДЕГА
ТРУДОВАЯ

15.06.2024 – 23.06.2024

Командир: Корчинов Семен Геннадьевич

ЧАСОВНЯ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1790 г. *Республика Карелия, Медвежьегорский район, ур. Пурдега*

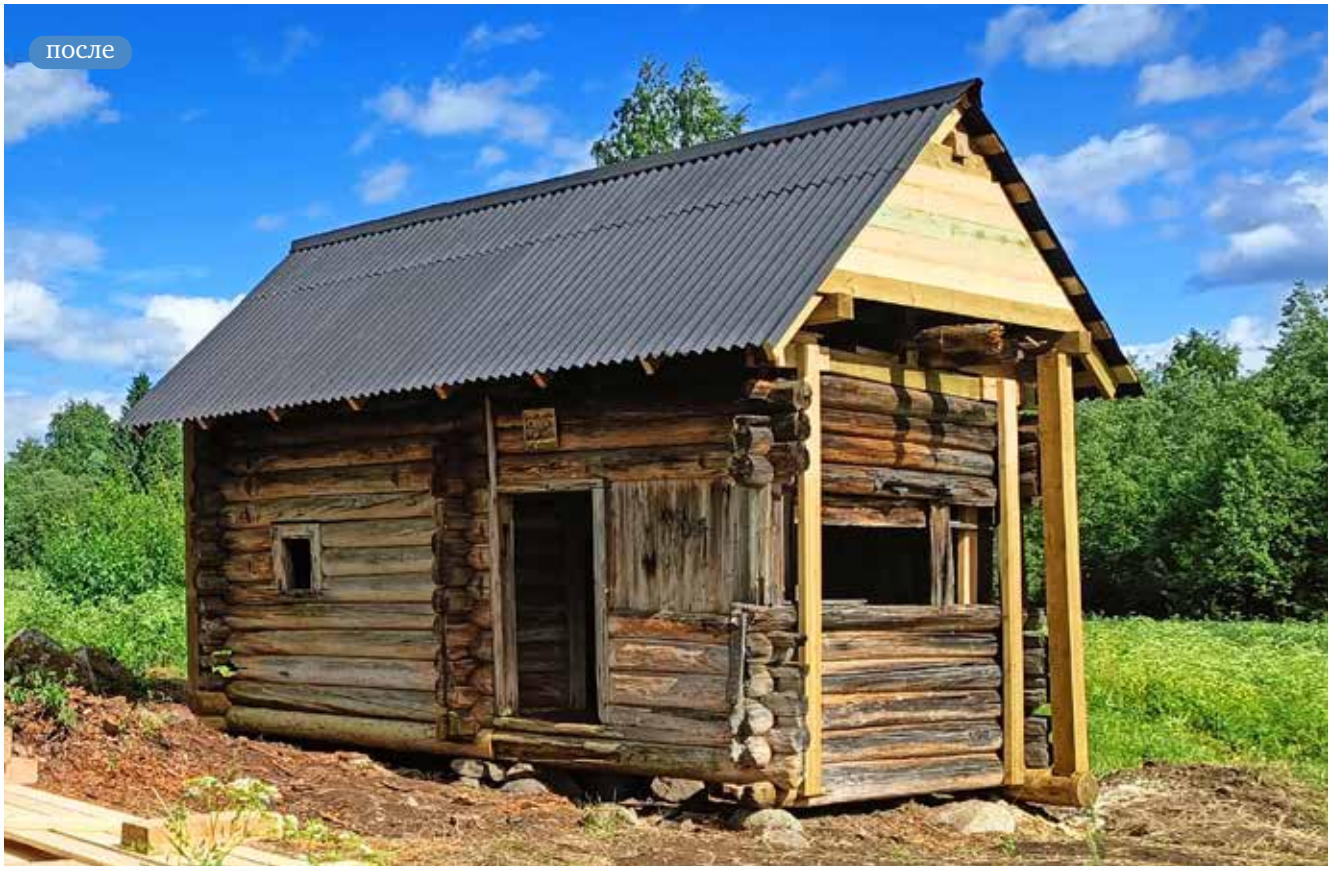

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– территория вокруг часовни расчищена от кустарника;
– расчищены завалы внутри и вокруг часовни;
– укреплен валунный фундамент, по периметру часовни устроен водоотвод;
– выровнена геометрия часовни, установлены нижние венцы на месте утраченных;
– крест с небольшой рубленой главкой демонтирован и складирован внутри часовни;
– стены, потолок, пол часовни расчищены от мха и плесени;
– сохранившиеся в завалах элементы конструкций складированы под навесом рядом с часовней;
– смонтирована консервационная кровля с покрытием ондулином.

ЭКСПЕДИЦИЯ
МАГАЗЕЯ
МИССИОНЕРСКАЯ,
ТРУДОВАЯ

30.07.2024 – 09.08.2024

Командир:
Священник
Владимир Суханов

ЦЕРКОВЬ ПРЕП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ

1850 г. *Архангельская область, Онежский район, д. Ворзогоры*

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1636 г. *Архангельская область, Онежский район, д. Ворзогоры*

ХРАМ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ

1888 г. *Архангельская область, Онежский район, д. Мондино*

МАГАЗЕЯ (АМБАР)

Архангельская область, Онежский район, д. Ворзогоры

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– окошена трава у магазеи и у храма прпп. Зосимы и Савватия;
– вынесен мусор;
– демонтирован с кровли и сложен в интерьере ветхий тес;
– укреплены и частично заменены ветхие верхние бревна сруба;
– установлена обрешётка и частично уложен профнастил.

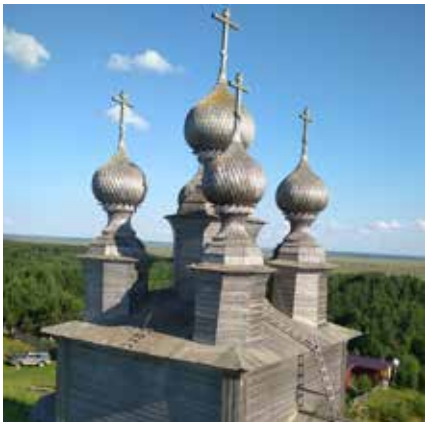

ЭКСПЕДИЦИЯ
ВЕРХОВАЖЬЕ
ТРУДОВАЯ

13.07.2024 – 28.07.2024

Командир: Кузьмичев Валерий Викторович

ЧАСОВНЯ ПРЕП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ

Предположительно кон. XIX в. *Вологодская область, Верховажский район, д. Матвеевская (Фомина Гора)*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– укреплен фундамент для сооружения притвора на месте утраченного;
– смонтирована нижняя часть венцов воссоздаваемого притвора;
– продолжены работы по изготовлению иконостаса;
– произведен осмотр состояния и уход за часовнями в деревнях Костюнинская, Писунинская, Потуловская, Фроловская, Афонинская, Основинская, Киселево, Григоровская, Удальцовская и церковью Успения Божией Матери на Верхнетерменьгском погосте.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЯБЛОНЬ-ГОРКА
ТРУДОВАЯ

03.08.2024 – 11.08.2024

Командир: Кочетков Евгений Леонидович

ЧАСОВНЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

XIX в. *Архангельская область, Плесецкий район, ур. Яблонь-Горка*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– территория вокруг часовни расчищена от кустарника и мусора;
– смонтирована тесовая кровля из двух слоев теса и бересты на полицах восьмерика;
– установлена главка, изготовленная плотником В.И. Казаковым в 2017 году;
– смонтирована тесовая кровля из двух слоев теса и бересты на пять из восемь граней шатра часовни.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НИЖНЯЯ ЗОЛОТИЦА
ТРУДОВАЯ

15.09.2024 – 24.09.2024

Командир: Священник Дмитрий Николаев

ХРАМ ПРЕП. АНТОНИЯ СИЙСКОГО

1799 г. *Архангельская область, Приморский район, д. Нижняя Золотица*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– демонтированы: ветхий шифер на кровле, отделка стен алтаря 2 пол XXв.-нач. XXI в. (гипсокартон, вагонка), печи на солее, две печные трубы, ветхие полы;
– для замены аварийного пола в алтаре и на солее расчищено подпольное пространство, установлено 22 опорных столбика и др. конструкций, уложен дощатый настил;
– установлены новые конструкции и уложены полы в алтаре и на солее;
– установлены два сжима на южной стене алтаря;
– изготовлен Престол;
– установлены конструкции иконостаса, являющиеся одновременно противоаварийной конструкцией для восточной стены основного объема;
– изготовлен и установлен крест на основном четверике;
– установлены консервационные кровли на всех объемах с использованием листов ондулина;
– установлена молниезащита.

ЭКСПЕДИЦИИ
НИЖНЯЯ ЗОЛОТИЦА–1, 2, 3
ТРУДОВЫЕ

15.07.2024 – 24.07.2024
22.07.2024 – 31.07.2024
17.09.2024 – 26.09.2024

Командир: Мелентьев Никита Владимирович

ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– доставлены материалы для храмов в Верхней и Нижней Золотицах;
– проведены противоаварийные работы по западному крытому крыльцу (восполнена утраченная обшивка, установлена консервационная кровля) и северному крыльцу (установлена противоаварийная конструкция под навес и консервационная кровля);
– установлена консервационная кровля на западном скате основного объема, на шатре и полицах колокольни;
– восполнены утраты листовым металлом и проведена окраска сохранившихся кровель на основном объеме и на алтаре;
– укреплены и продублированы конструкции колокольни, находящиеся в аварийном состоянии;
– установлен крест на колокольне;
– установлены щиты в проемах на ярусе звона;
– закрыты светопрозрачным материалом нижние окна основного объема, окна на западном крыльце и на втором ярусе колокольни;
– установлены лестницы, ведущие на ярус звона, и уложены полы на втором ярусе колокольни.
– установлены 4 подпорки из бруса 150*150 для противодействия дальнейшему крену колокольни.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Престольный праздник храма, отслужена Божественная литургия.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ВЁГОРУКСА
ТРУДОВАЯ

15.09.2024 – 24.09.2024

Командир: Шейкина Мария Олеговна

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Середина XVIII в. *Республика Карелия, Медвежьегорский район, с. Вёгорукса*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– покрашены главки и кресты колокольни и основного объема храма;
– установлено консервационное покрытие из стеклоизола и защитного настила из досок на ярусе звона;
– герметизированы люк и места примыкания консервационного покрытия к столбам на ярусе звона;
– конструкции колокольни обработаны антисептиком;
– демонтирована часть временных конструкций;
– проведена уборка в храме;
– напечатаны и привезены три образа из этого храма: Свт. Николай, Богоматерь Знамение, Апостол Петр, фотокопии предоставлены Русским Музеем.

ЭКСПЕДИЦИЯ
МАТВЕЕВО
РАЗВЕДКА

29.05.2024

Командир: Шалохманов Максим Александрович

ЧАСОВНЯ

XIX в. *Костромская обл., Парфеньевский район, с. Матвеево*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– проведено обследование текущего состояния объекта;
– выполнены обмеры и фотофиксация.

ЭКСПЕДИЦИЯ
УНЕЖМА
ТРУДОВАЯ

06.08.2023 – 13.08.2024

Командир: Мелентьев Никита Владимирович

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1826 г. *Архангельская область, Онежский район, д. Унежма*

ВЫАОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– профессиональными плотниками совместно с добровольцами проекта «Общее Дело» завершена реставрация основного четверика и алтарного прируба;
– 11 августа, в день Рождества святителя Николая Чудотворца протоиереем Алексеем Яковлевым отслужена Божественная литургия;
– в деревне Кушерека установлен Поклонный крест на месте церкви Вознесения Господня, перенесенной в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
– добровольцы «Общего Дела» установили молниезащиту на храме.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НИМЕНЬГА
ТРУДОВАЯ

17.08.2023 – 25.08.2024

Командир: Заливакин Максим Юрьевич

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

1878 г. *Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– осуществлен покос травы по периметру церкви и колокольни;
– смонтирован навес для хранения пиломатериалов;
– доставлены, разгружены и складированы 15 куб.м пиломатериалов;
– простроганы 100 досок, проведено дорожение 84 досок, доски покрыты антисептиком;
– заменено покрытие навеса над штабелем из бревен;
– завершена расчистка чердачного пространства от мусора и грунта.

ЭКСПЕДИЦИИ
Вирма–1,2
ТРУДОВЫЕ

10.07.2024 – 21.07.2024
20.07.2024 – 28.07.2024

Командиры: Пахоменкова Елена Дмитриевна, Шешнин Валентин Вячеславович

ХРАМ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

1695 г. *Республика Карелия, Беломорский район, с. Вирма*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла в церкви совершена Божественная литургия. Служил настоятель храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких г. Беломорска иерей Александр Баруев.
– продолжены работы по консервации кровли трапезной, начатые в 2023 году. Кровля из двух слоев теса и металлических профилированных листов между ними. Верхний слой теса с дорожением;
– установлен молниеотвод;
– в местах утраченного остекления в окнах установлены стекла;
– изготовлен, освящен и установлен крест на центральной главе церкви;
– по окончании работ совершен благодарственный молебен.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ОНЕЖЕНЫ
ТРУДОВАЯ

20.07.2024 – 28.07.2024

Командир: Савина Александра Вячеславовна

ХРАМ МУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

1831 г. *Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Онежены*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– на звоннице разобраны обрушившиеся конструкции, укреплена стропильная система, частично заменена обрешетка, установлена консервационная кровля, установлен временный пол, изготовлен и установлен щит в дверной проем;
– организованы вентиляционные продухи в фундаменте;
– устроены водоотводящие канавки;
– проведена гидроизоляция мест выхода сохранившихся частей конструкции барабана и крыши на основном объеме;
– изготовлено укрытие для обрушившейся главки;
– в храме сложены сохранившиеся подлинные элементы.

В ходе экспедиции настоятелем храма Богоявления Господня деревни Шуньга иереем Сергием Коловым был отслужен молебен.

ЭКСПЕДИЦИИ
ГОЛЬЯНИЦЫ–1, 2, 3, 4
ТРУДОВЫЕ

27.07.2024 – 25.08.2024

Командир:
Гончаров Николай Валерьевич

ЧАСОВНЯ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

XVIII в. *Республика Карелия, Пудожский район, ур. Гольяницы*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ (помощь профессиональным плотникам-реставраторам):

– возведены строительные леса для установки двух главок;
– установлена главка, обшитая берестой и лемехом;
– проведены фундаментные работы по установке четырех бетонных столбов;
– изготовлено крыльцо и установлено на фундаментные столбы;
– доски на кровлю и заготовки на крыльцо пропитаны антисептиком;
– проведены кровельные работы на основном объеме часовни и на крыльце;
– изготовлены и установлены окна;
– изготовлены Престол, два аналоя и два подсвечника.

ЭКСПЕДИЦИИ
БОЛЬШИЕ СЕТКИ–1,2
ТРУДОВЫЕ

24.06.2024 – 28.06.2024
08.08.2024 – 10.08.2024

Командир: Сахоненко Николай Витальевич

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

XVIII в., в 1852 г. перевезена с погоста Теребутунь. *Тверская область, Кашинский район, с. Большие Сетки*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– покос травы вокруг храма;
– уборка старых пней;
– разборка всех настилов на лесах вокруг всего храма;
– пробивание шурфов для исследования фундамента колокольни;
– рассортировка, измерение, фотографирование сохранившихся упавших верхних и внутренних деталей конструкций храма;
– участие городском Крестном ходе с мощами свт. блг. Анны Кашинской;
– подготовка к проведению богослужения на рождество свт. Николая Мир Ликийских Чудотворца;
– устройство конструкции временного иконостаса, доставка и установка икон;
– проведение праздничной службы;
– ознакомление священнослужителей и богомольцев с подготовкой к реставрации храма;
– проект, объявления, номер счёта для пожертвований;
– изготовление и установка информационного стенда у храма;
– установка временной подпорной конструкции из брусьев под второй ярус, внутри колокольни;
– консервация всего храма на зиму.

ЭКСПЕДИЦИИ	22.06.2024 – 30.06.2024	Командир:
ХАВРОГОРЫ–1, 2, 3	29.06.2024 – 07.07.2024	Воеводин
ТРУДОВЫЕ	06.07.2024 – 14.07.2024	Илья Владимирович

ЧАСОВНЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

1731 г. *Архангельская область, Холмогорский район, п. Часовня*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– продолжена, начатая в 2023 г., реставрация стен и конструкций перекрытия галереи;
– выровнен сруб часовни;
– цоколь часовни доложен гипсовыми валунами;
– исторические доски пола галереи очищены от вара и прочих загрязнений.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ:
Министерство Культуры Российской Федерации
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия
Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области
Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области
Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества им. В.С.Рахманова
Музей-заповедник «Кижи»
АНО «Традиция»
Компанию «Ондулин. Легкие кровельные системы»
Благотворительный фонд «Северный духовный путь»
ООО «ТихвинПроектРеставрация»
АРЦ «Заонежье»
ООО «Архрест Проект»

НАШ АДРЕС:
127224, г. Москва,
проезд Шокальского, 48

e-mail: info@obsheedelo.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Настоятель храма в честь
преп. Серафима Саровского
в Раеве г. Москвы
протоиерей Алексей Яковлев

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:
Курицына Лидия Сергеевна
тел.: +7-926-729-42-49

Заливакин Максим Юрьевич
тел.: +7-919-105-78-05

Смирнов Павел Александрович
тел.: +7-977-809-26-01

ТОЛЬКО ВОЗРОЖДАЯ
СВЯТЫНИ ПРОШЛОГО,
МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ
НА ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ.
www.obsheedelo.ru
